

# BAUINFORMATION

Januar 2019

HPA Railway Infrastructure  
Donnerstag, 24. Januar 2019

---

01

Baumaßnahmen 2018 (Rückblick)  
und 2019

---

02

Lokservicestelle  
Inbetriebnahme der Schiebebühne

---

03

Lokabstelldisposition im Hafen

---

04

Projekt  
Neubau Rethebrücke Bahnanbindung

---

05

Teilerneuerung Stellwerk Whf

---

06

Eingeschränkte Werkstatteleistung ab vsl.  
Juni 2019

---

07

Organisatorisches



---

# 01

---

Baumaßnahmen 2018 (Rückblick)  
und 2019

Stefan Stein, Toralf Lübcke

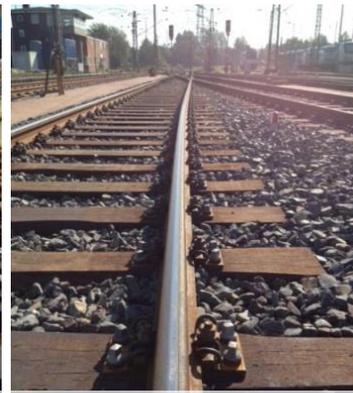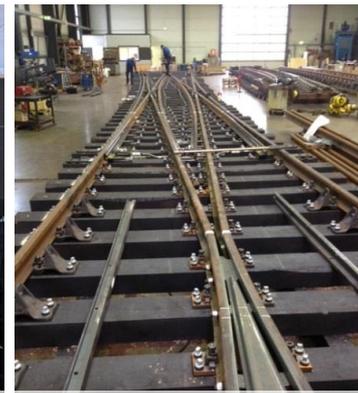


## Baumaßnahmen 2018/2019



## Baumaßnahme: Verlegung Bft Peute

November 2018 – 1. Quartal 2019



Umverlegung der Gleise / Weichen in 5 Bauabschnitte

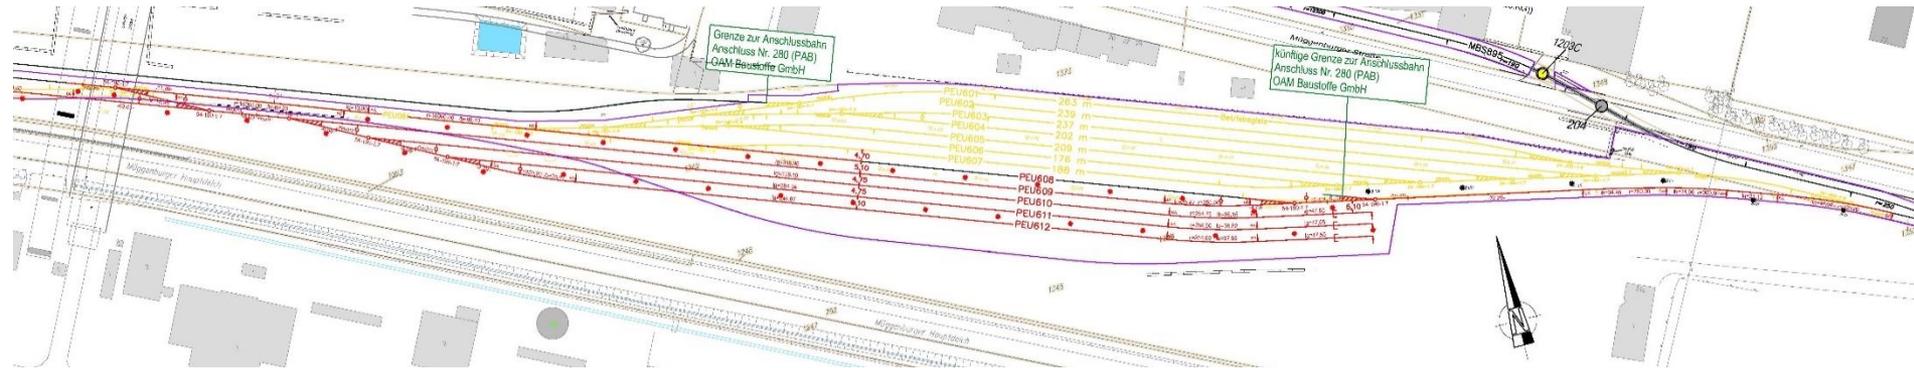

## Baumaßnahme: Verlegung Bft Peute



Quelle: Alle Bilder © HPA-RI22 Stefan Stein

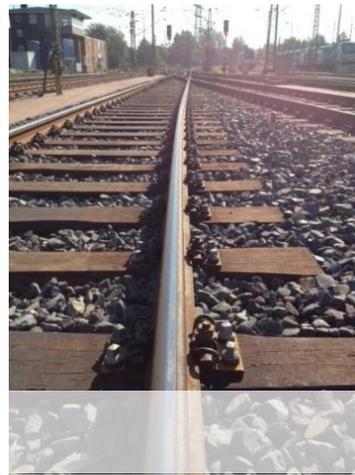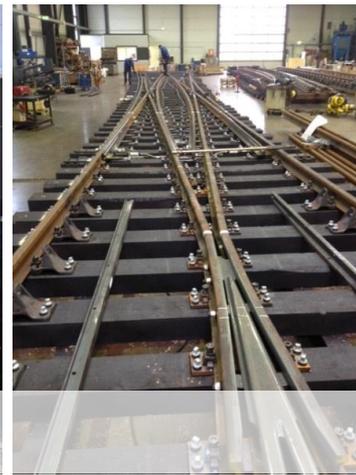


## Baumaßnahmen 2019






## Baumaßnahmen: ASE

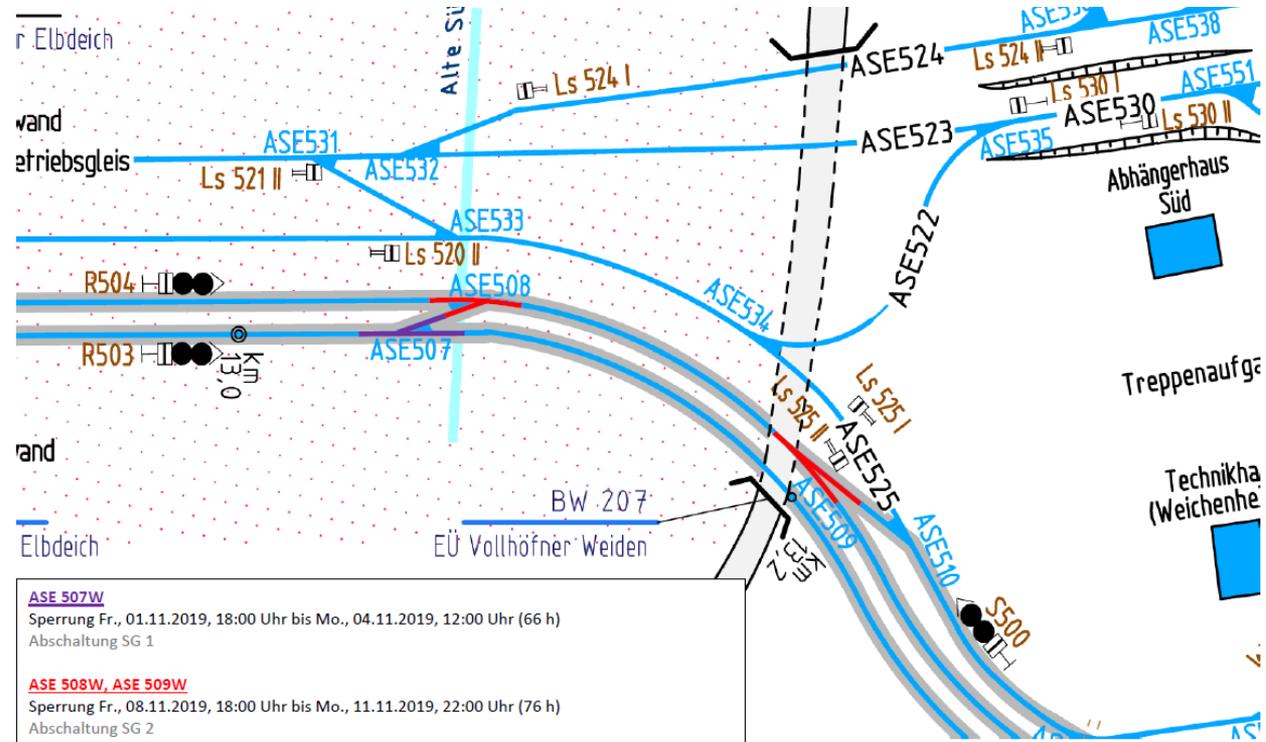

## Baumaßnahmen: ASE

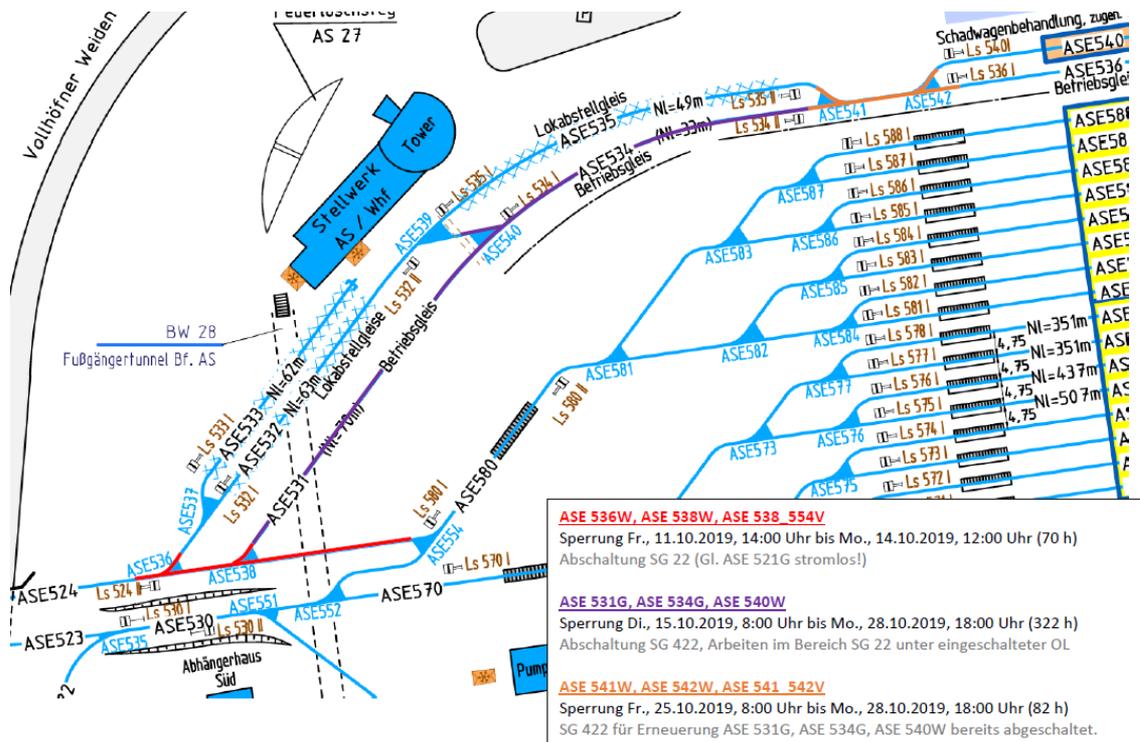

## Baumaßnahmen: Waltershof

**Sperrung aller markierten Gleise und Weichen ab  
Fr., den 15.11.2019 um 12:00 Uhr  
Gleis WHO 066G für Logistik**

**WHO 029G, WHO 028G, WHO 030W**

**Sperrung bis Do., den 21.11.2019 um 12:00 Uhr (144 h)**

SG 24 aus, Arbeiten in WHO 028G unter eingeschalteter SG 17  
Gleis WHO 027G für Logistik 4 x 1 h/Tag

**WHO 031W, WHO 033W**

**Sperrung bis So., den 24.11.2019 um 12:00 Uhr (+72 h)**

Bautrenner in SG 24 / WHO 029G, 028G mit eingeschalteter OL, GL  
25/26 (Lokabstellung) ohne OL

**WHO 032W, WHO 033W**


**Sperrung bis Mi., den 27.11.2019 um 06:00 Uhr (+66 h)**

Bautrenner in SG 24 / WHO 029G, 028G mit eingeschalteter OL, GL  
25/26 (Lokabstellung) ohne OL

**WHO 034W, WHO 035W**

**Sperrung bis Fr., den 29.11.2019 um 22:00 Uhr (+64 h)**

Bautrenner in SG 24 / WHO 029G, 028G mit eingeschalteter OL, GL  
25/26 (Lokabstellung) ohne OL  
Rückbau Bautrenner

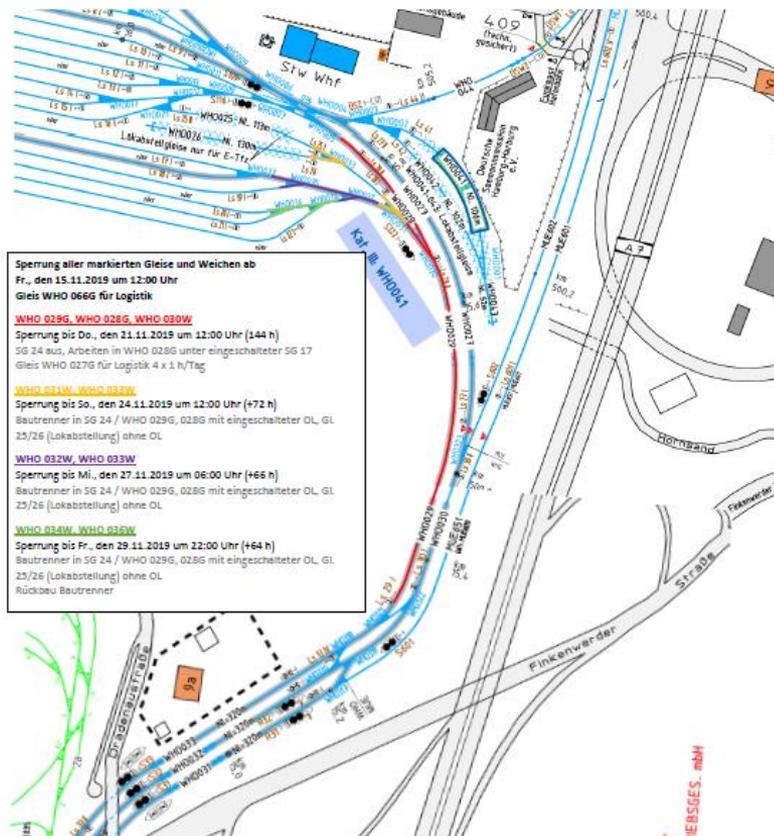

## Baumaßnahmen: Waltershof

**Sperrung WHO 030G und WHO 323W ab  
Fr., den 06.12.2019 um 12:00 Uhr  
Gleis WHO 066G für Logistik**


**WHO 030G, WHO 323W**

**Sperrung bis Di., den 10.12.2019 um 06:00 Uhr (90 h)**

**SG 804 aus**


**Gleis MUE 631 für Logistik:**

- Sa. 07.12.2019 ab 16:00 Uhr für 3 x 1,0 h
- So. 08.12.2019 für 3 x 1,0 h
- Mo. 09.12.2019 für 3 x 1,0 h

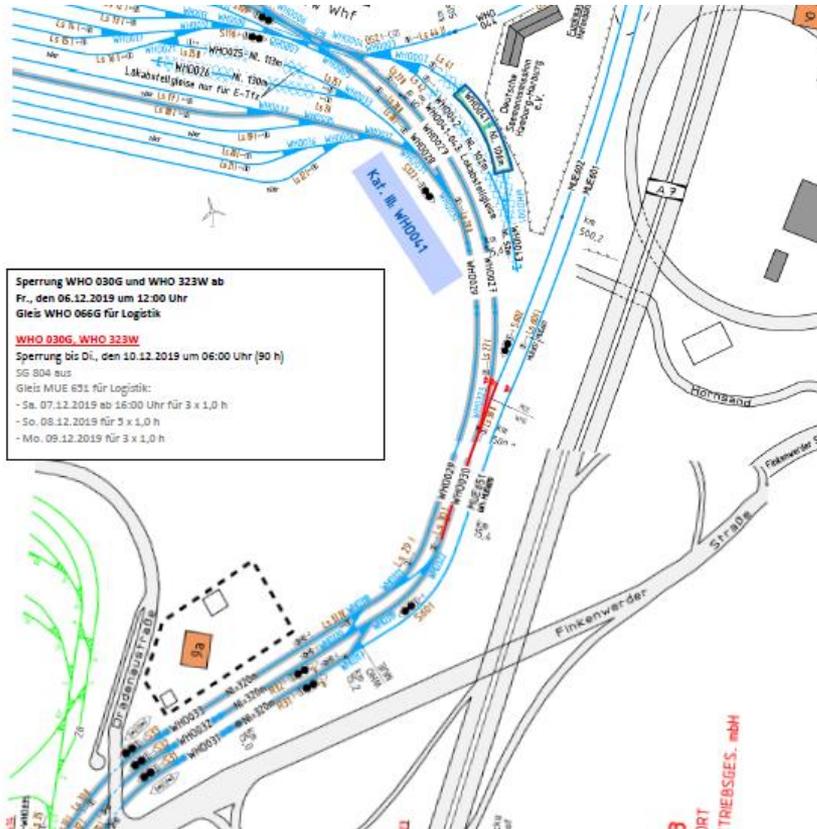




## Baumaßnahmen: Altenwerder Ost

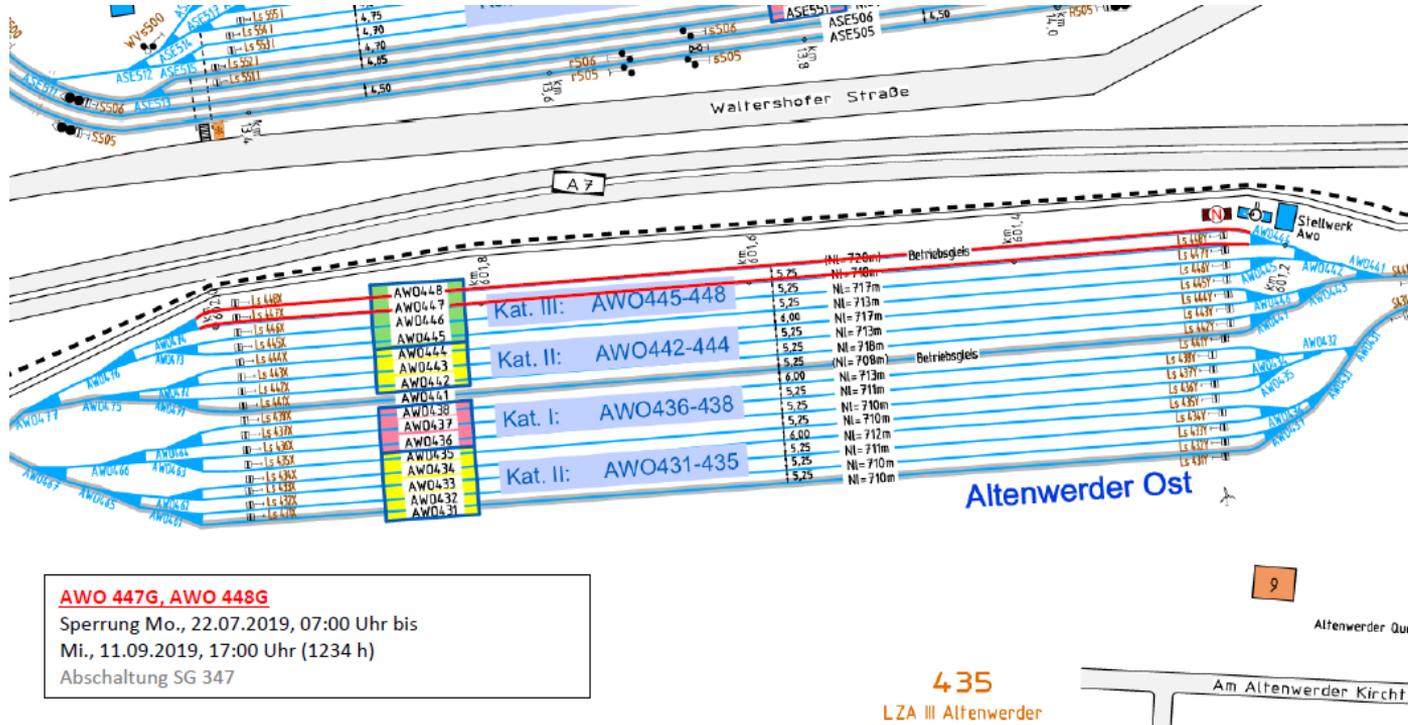


## Baumaßnahmen: Reiherstieg Ost- "Banane"

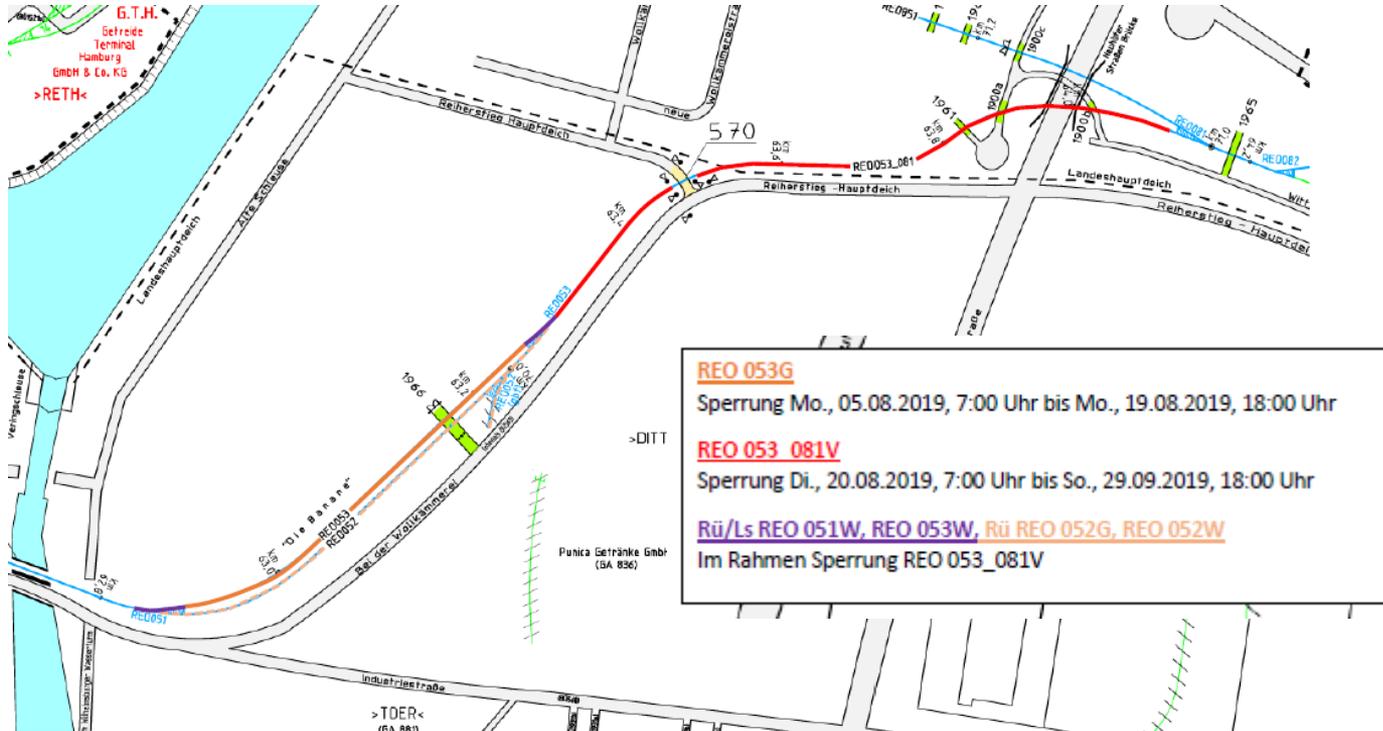


## Baumaßnahmen: diverse

### Hohe Schaar

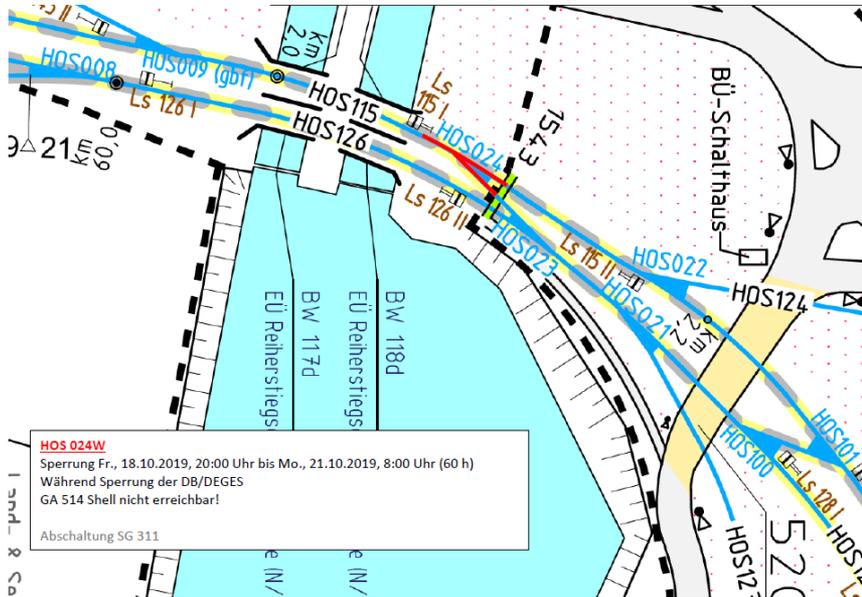


### Hamburg Süd 3.-4 Quartal

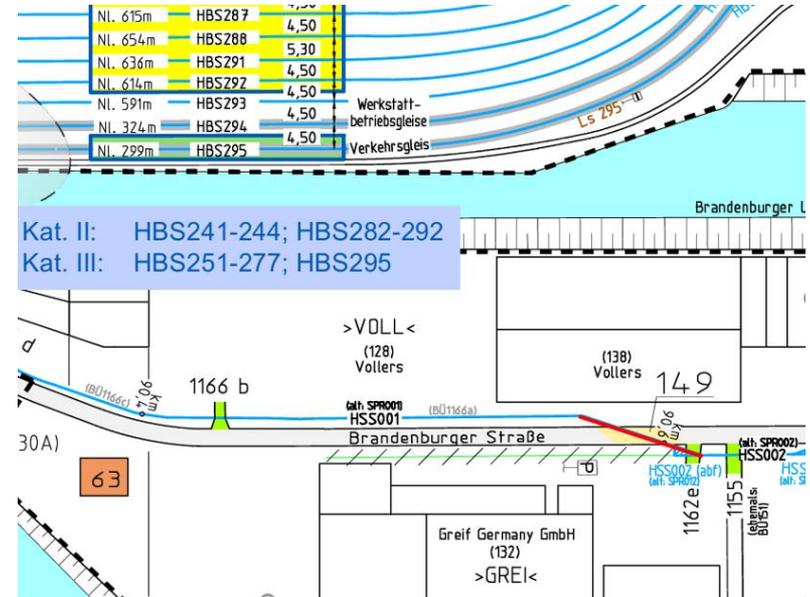

## Baumaßnahmen: diverse

### Pollhornweg

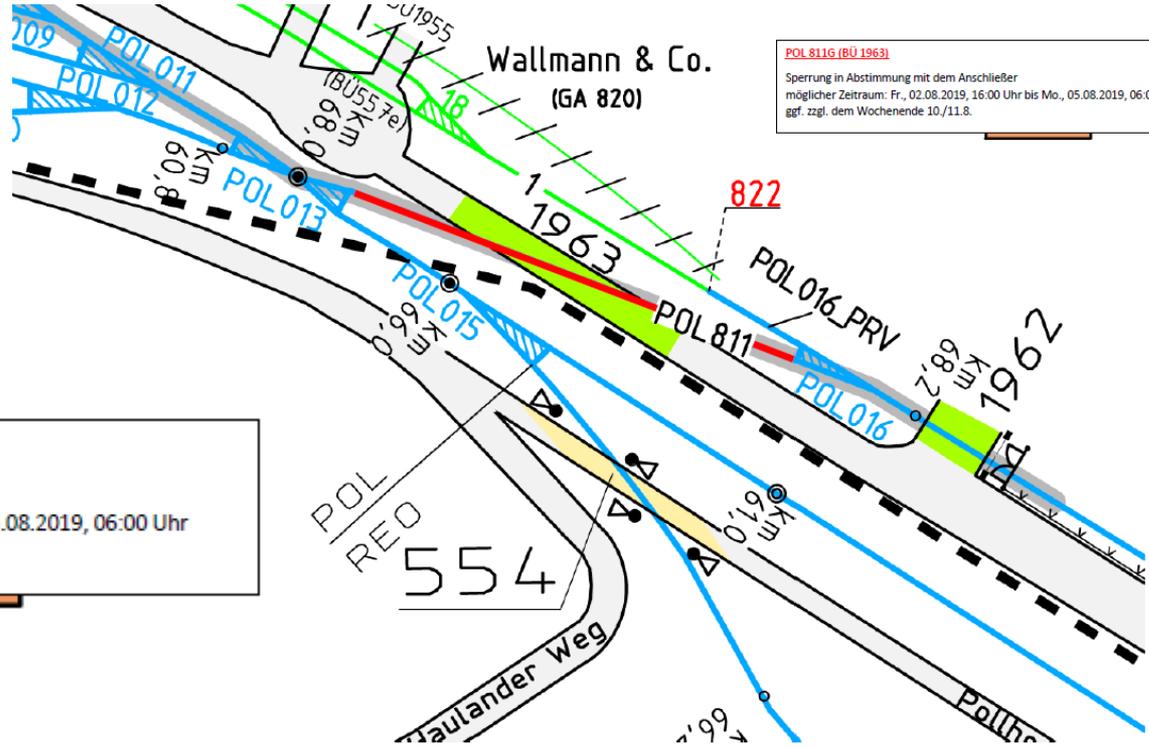

**POL 811G (BÜ 1963)**  
Sperrung in Abstimmung mit dem Anschließter  
möglicher Zeitraum: Fr., 02.08.2019, 16:00 Uhr bis Mo., 05.08.2019, 06:00 Uhr  
ggf. zzgl. dem Wochenende 10./11.8.

**POL 811G (BÜ 1963)**  
Sperrung in Abstimmung mit dem Anschließter  
möglicher Zeitraum: Fr., 02.08.2019, 16:00 Uhr bis Mo., 05.08.2019, 06:00 Uhr  
ggf. zzgl. dem Wochenende 10./11.8.

# 02


---

Lokservicestelle  
Inbetriebnahme der Schiebebühne

Stefan Stein

# Lageplan Lokservicestelle

Dradenauer Deichweg 2

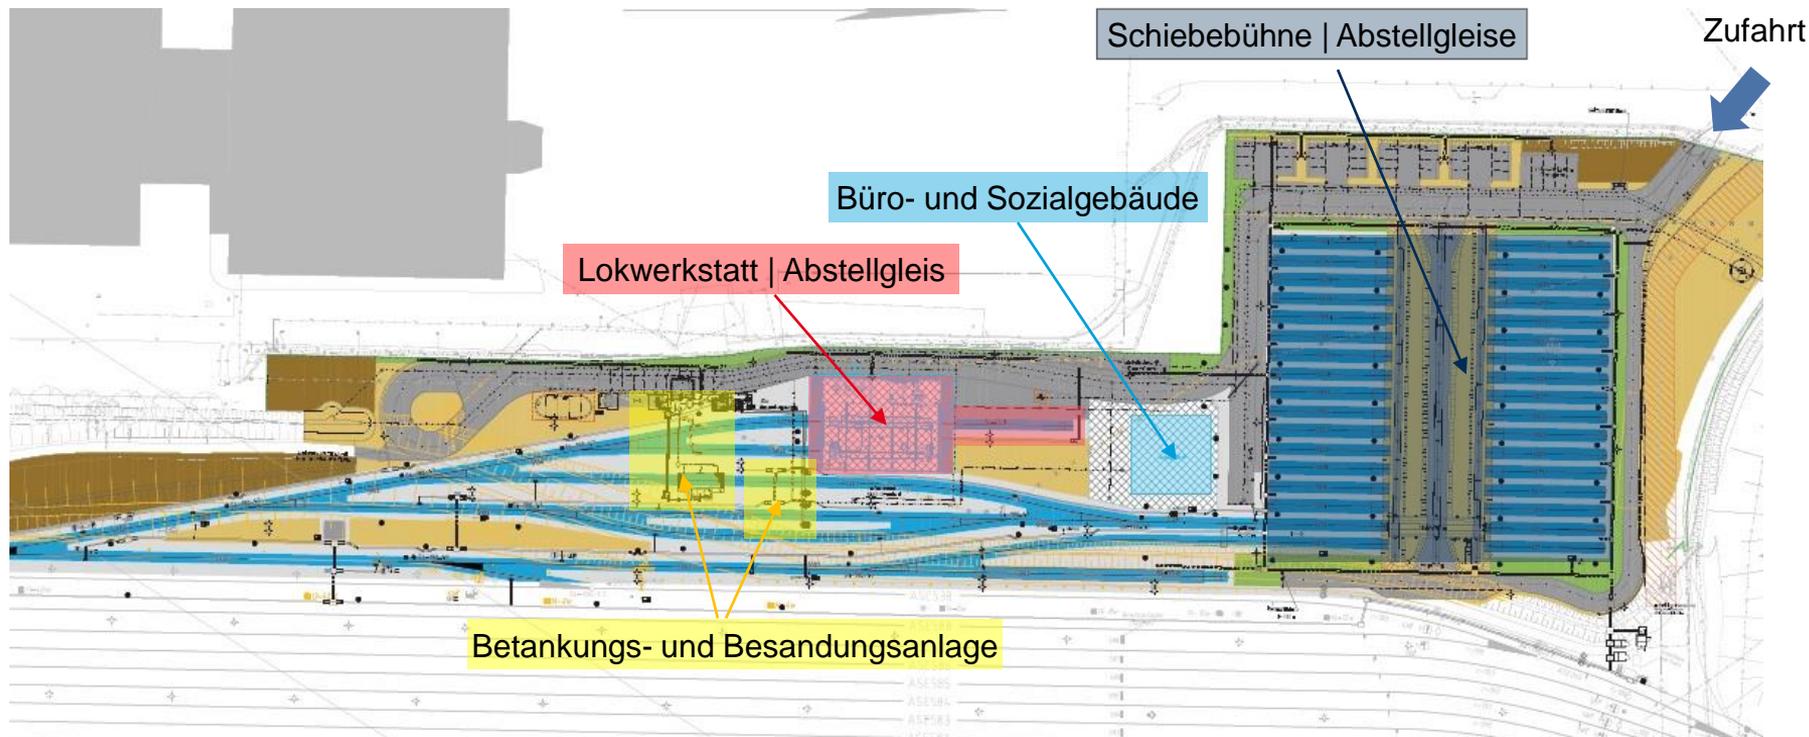



Besam


Lokwerkstatt-Außen



kstelle


Lokwerkstatt-Innen

Quelle: Alle Bilder © HPA-RIS Stefan Stein

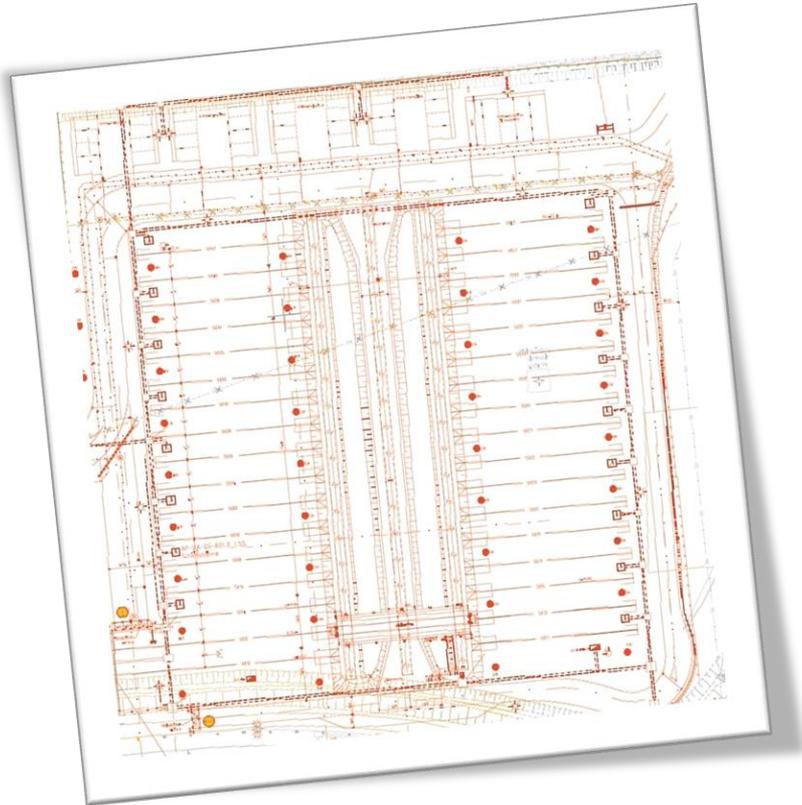

## Vollautomatische Schiebebühne

- Länge 25 m
- Breite ca. 8,40 m
- Tragfähigkeit bis 135 t
- Vollautomatikbetrieb
- Fahrwegüberwachung mittels Laserscanner
- 32 Parktaschen

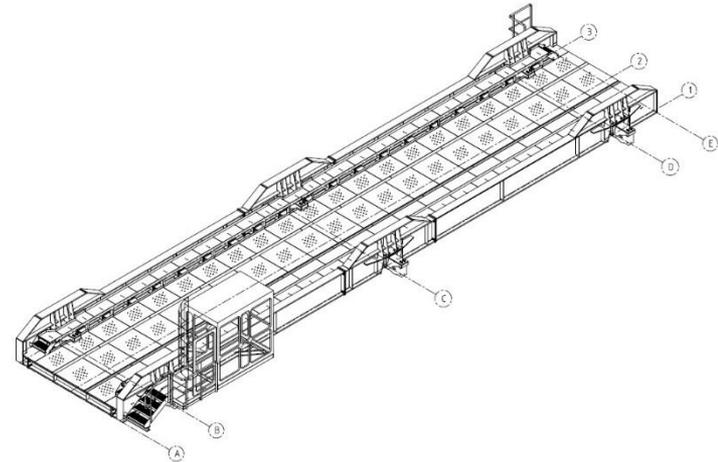

# Schiebebühne




August 2017



März 2017

Quelle: Alle Bilder © HPA-RIS Stefan Stein

# Schiebebühne

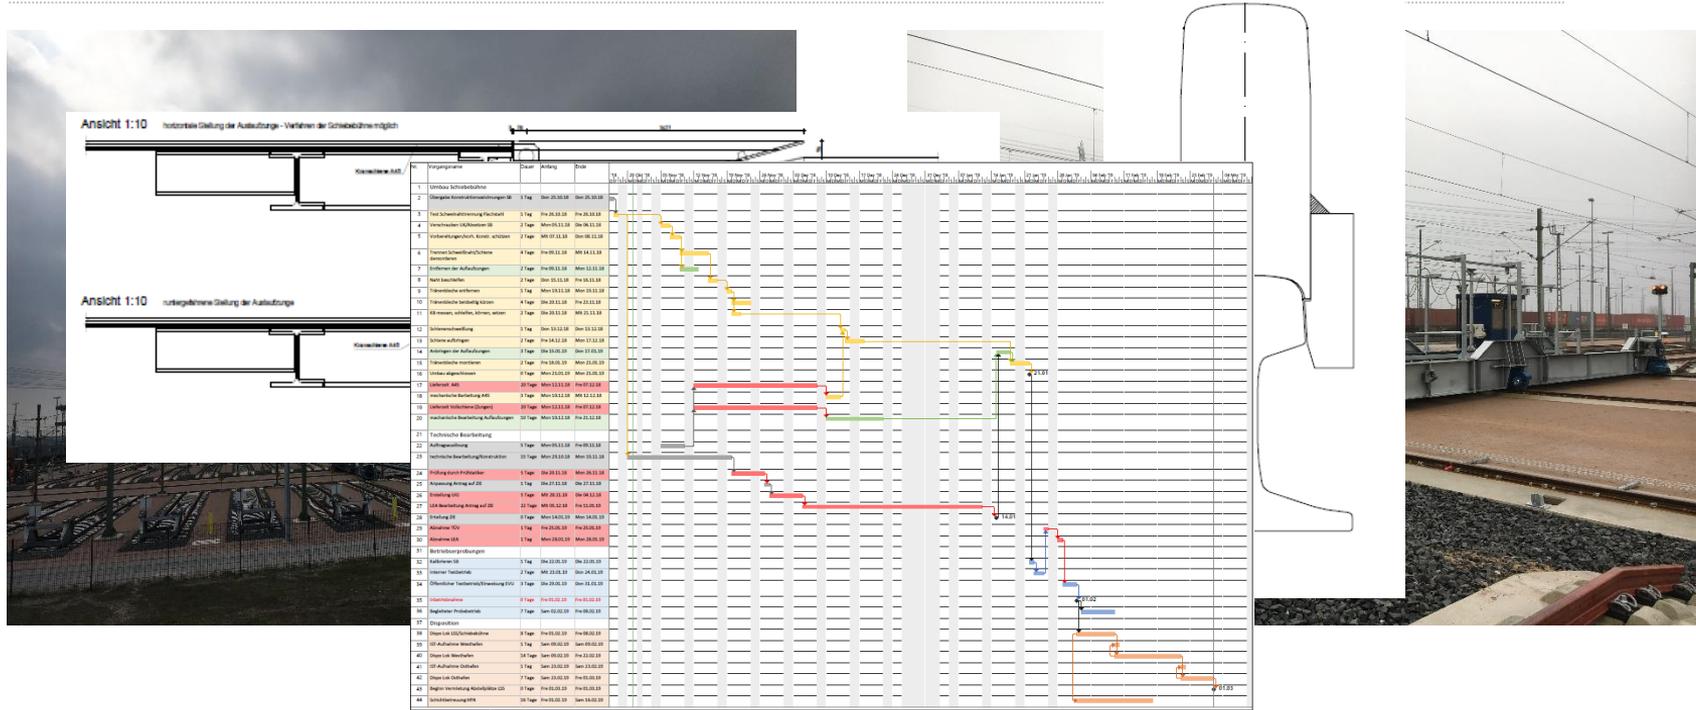

Quelle: Alle Bilder © HPA-RIS Stefan Stein

## geplante Inbetriebnahme: 01.03.2019

- vorbehaltlich der LEA-Abnahme am 21.02.2019
- geplanter 3-tägiger Testbetrieb für die EVU`s vor Inbetriebnahme
  - 25.02.-27.02.2019 jeweils 09:00Uhr bis 15:00Uhr
  - Anmeldung der EVU`S notwendig.
  - Einweisungen in die Bedienung der Schiebebühne durch HPA
  - Erstes Befahren der Schiebebühne mit Lok möglich (keine Abstellung)
- 7-tägiger Begleiteter Betrieb durch HPA im 24/7 vor Ort nach Inbetriebnahme
- Stufenweise Einführung der Lokdisposition
  - beginnend am 01.03.2019 mit nur LSS
  - Ausweitung auf Westhafen
  - 3. Stufe: vollständige Lokdisposition



# 03

---

Lokabstelldisposition im Hafen

Toralf Lübcke

- Neustart der Disposition Lokabstellung (LAB) Hamburger Hafen vsl. März 2019
  
- Inbetriebnahme in 3 Phasen
  - 1. Phase – nur Lokservicestelle (LSS)
  
  - 2. Phase – den gesamte Westhafen
  
  - 3. Phase – Woche Disposition Lokabstellung im gesamten Hafen

- Ausführung der Tätigkeit Disposition Lokabstellung ...
  - in Personaleinheit durch den Netzdispo Ost – **Rufnummer Dispo Lokabstellung 040 / 822 14 3411**  
(Telefonnummer in Anlage 8 der NBS wird angepasst)
- Ausführung der Tätigkeit Dateneingabe Hafen OST (Hamburg Süd + Hohe Schaar)...
  - durch Dispo Helfer Ost mit Dienstplanausweitung – **Rufnummer Dispo Helfer Ost 040 / 822 14 3493**

## GRUNDSATZ:

Jeder Streckenlok, die eine Abstellung benötigt, wird unter Angabe der Folgeleistung durch den Disponenten Lokabstellung ein Abstellplatz zugewiesen.


### Ausnahmen:

1. an **Rangierloks** wird kein Stellplatz vergeben, solange sie auf einen Stellplatz für Rangierloks fahren,
2. keine Stellplatzvergabe für Streckenloks, die einen vom EVU **gemieteten Stellplatz** anfahren,
3. **nur mit Zustimmung der Disposition Lokabstellung** und in Rücksprache mit dem Stellwerk können **Streckenloks auch in Behandlungsgleisen** auf die Folgeleistung warten (Kurzabstellung, Wende), Voraussetzung **Tf ist zu jeder Zeit erreichbar** und kann die Lok kurzfristig umsetzen


## Angaben zur Folgeleistung, können sein:

- Wende direkt auf Ausgangszug mit Angabe der Standzeit,
- Ausgangsleistung nicht bekannt; Abstellung mit konkretem Standzeitende,
- Ausgangsleistung nicht bekannt; Abstellung mit vsl. Standzeitende

## Zugeinfahrt – Lokabstellung disponieren

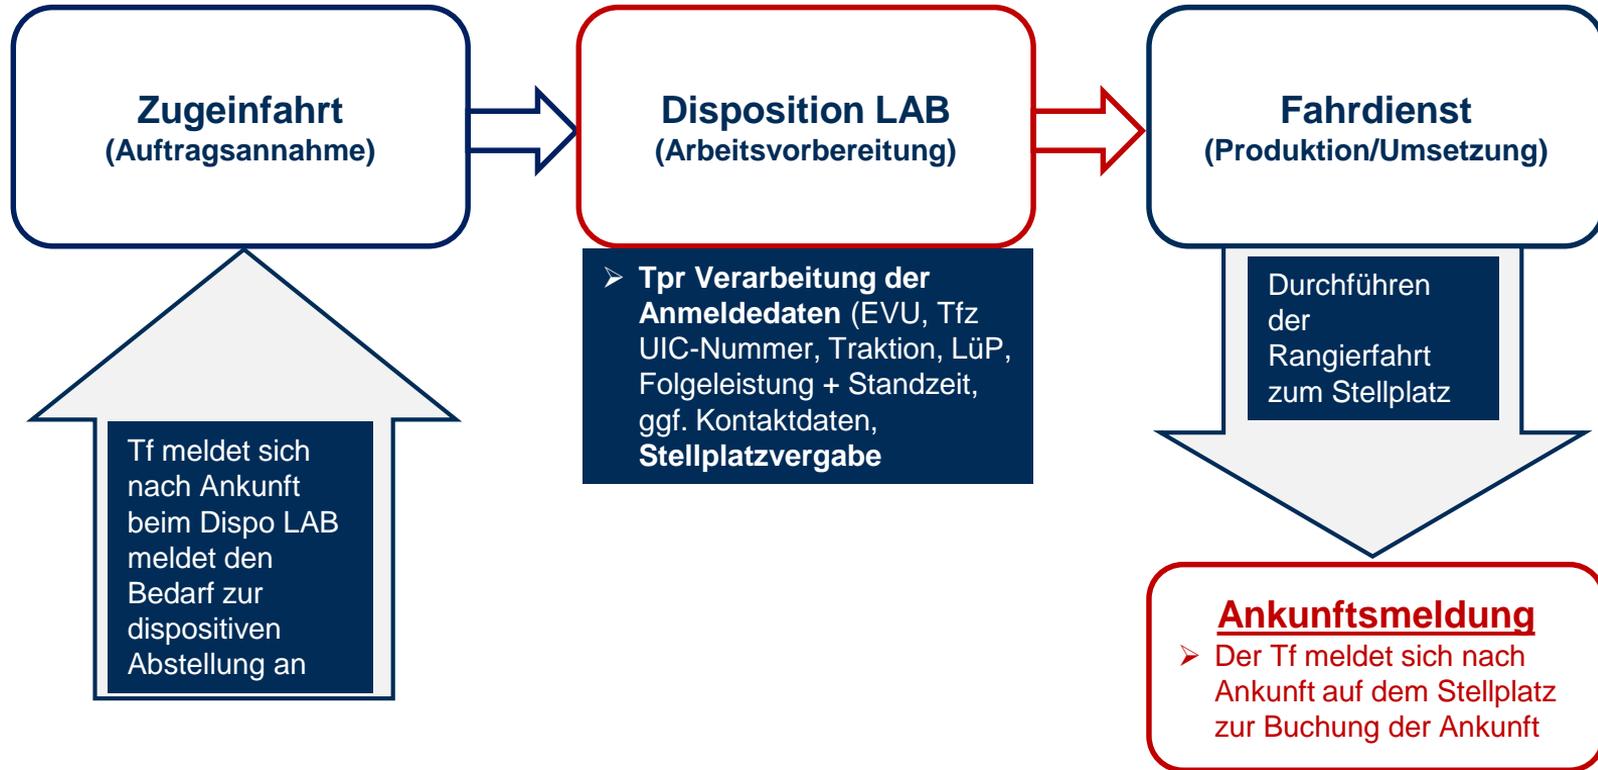


## Zugeinfahrt – Lokabstellung auf gemietetem Stellplatz

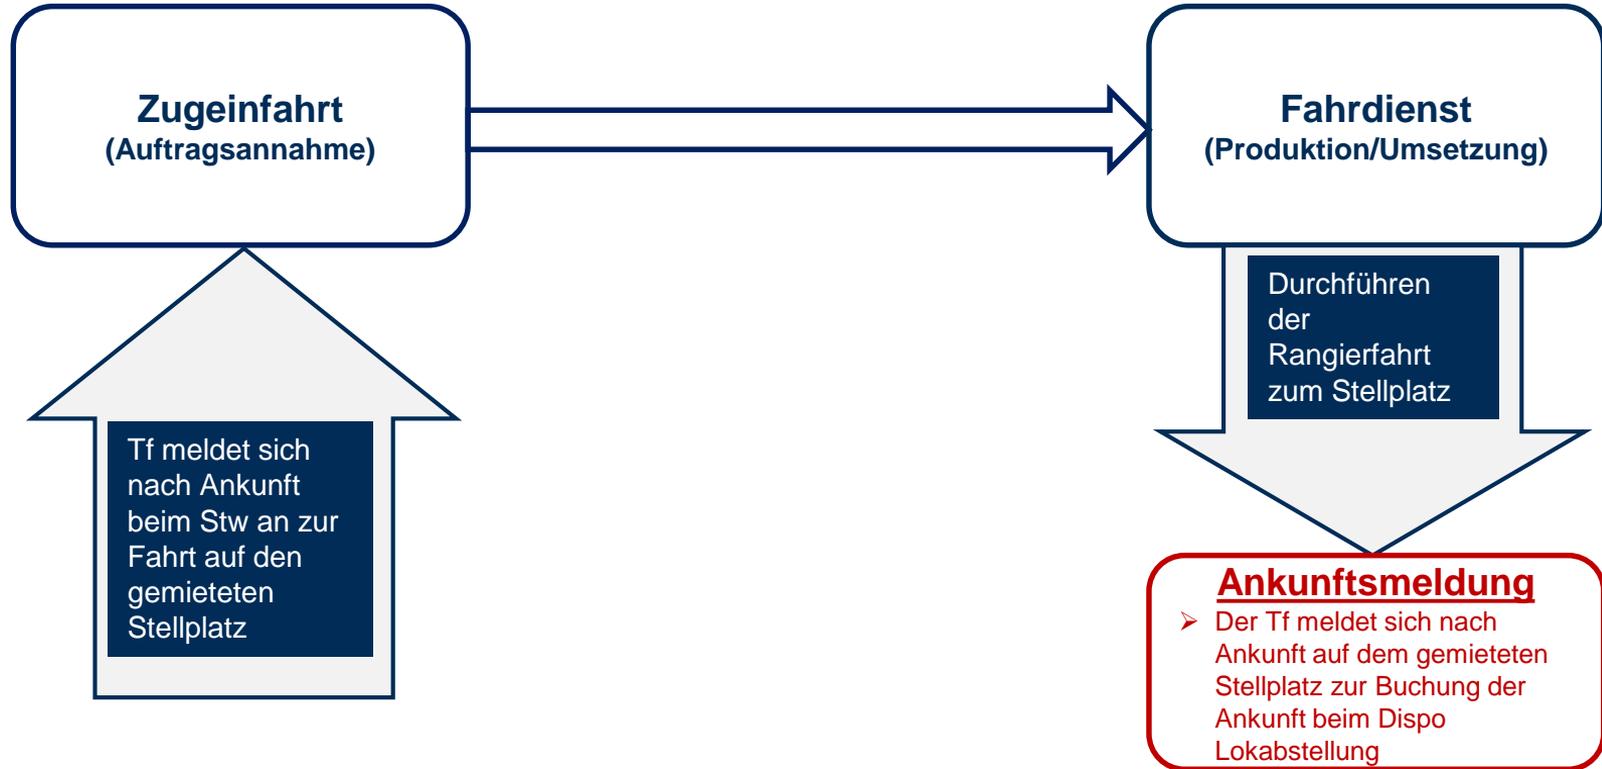

# Prozess Stellplatz verlassen (*dispositiv + gemietet*)

## Lokabstellung beenden (*auch gemietete Stellplätze*)

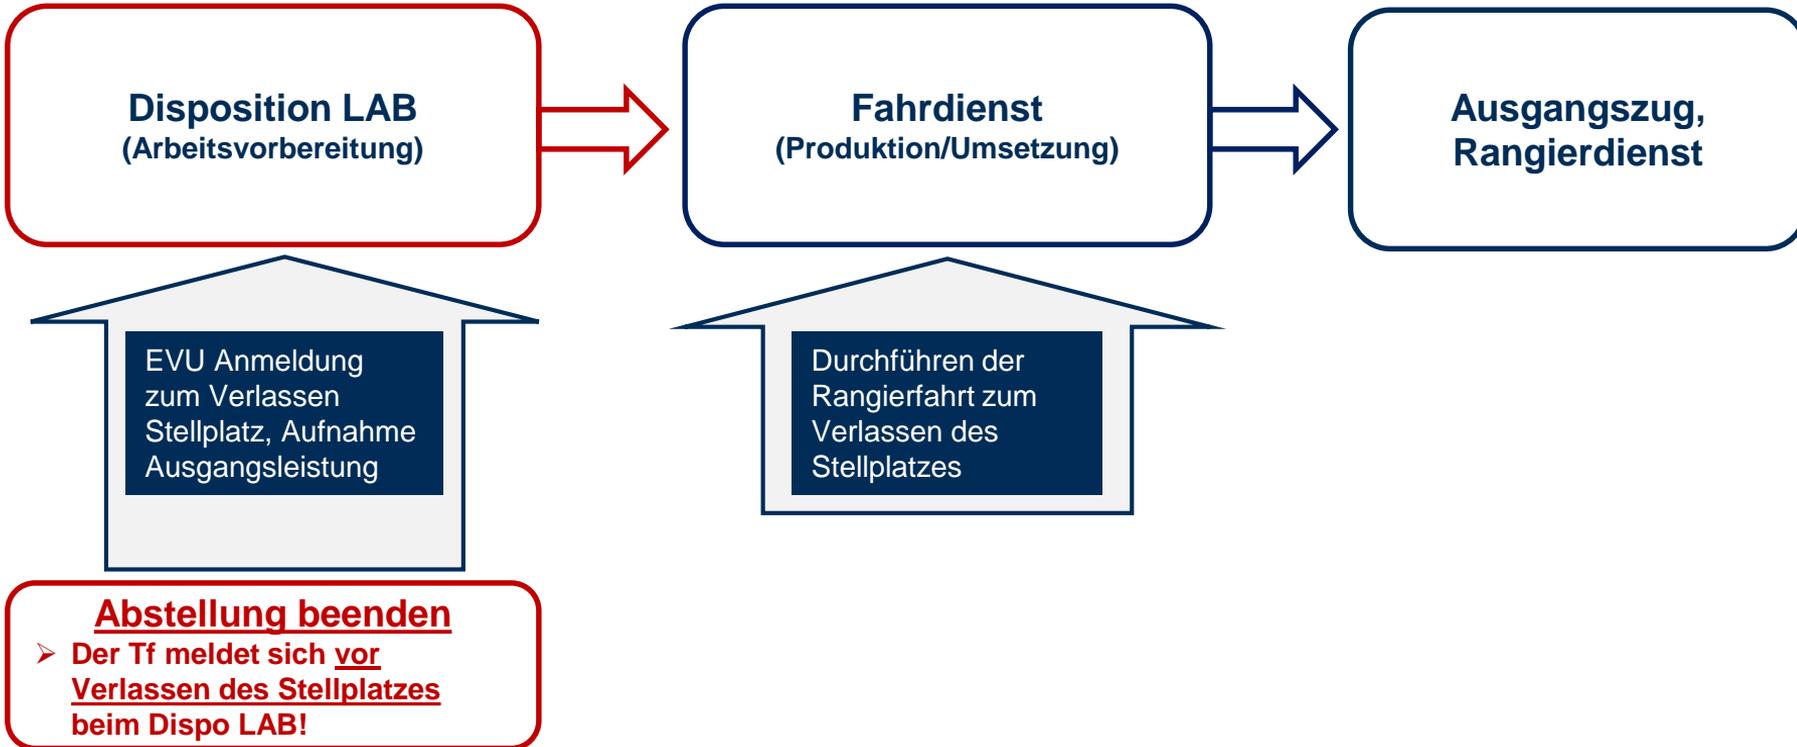

# Kennzeichnung der Lokabstellplätze



Alle Bilder: © HPA-RI14-4 Frank Lackmann

# 04

---

Projekt

Neubau Rethebrücke Bahnanbindung

Boris Funck



Quelle: HPA/2018

**Erfolgreiche Inbetriebnahme**  
der Anbindung  
**Nordkopp Hmb Hohe Schaar**  
am 14.12.2018

siehe auch:  
Ebl-Verfügung 021/2018  
vom 10.12.2018  
sowie  
Betriebsstellenbuch  
Ausgabe Nr. 4  
vom 09.12.2018

# Projekt Neubau Rethebrücke Bahnanbindung, Rückblick 2017- 2019



Erfolgreiche  
Anpassung der  
Schnittstelle  
Brücke /Stellwerk  
(Softwareanpassung)  
am 17.01.2019

Quelle: HPA/2018



Quelle: HPA/2018

## Offene Leistungen:


- Restleistungen Oberbau mit Sperrung Gleis RET 400 am 26.02.19 von 08:00 bis 20:00 Uhr
- Anpassung Gleisfeldbeleuchtung inkl. Baugrunderkundung von 02/2019 – vsl. 07/2019
- Fertigstellung der Anlagen der Deckenstromschiene auf den Brückenklappen und IBN der Oberleitung bis vsl. 07/2019

# 05

---

Teilerneuerung Stellwerk Whf

Markus Wolf

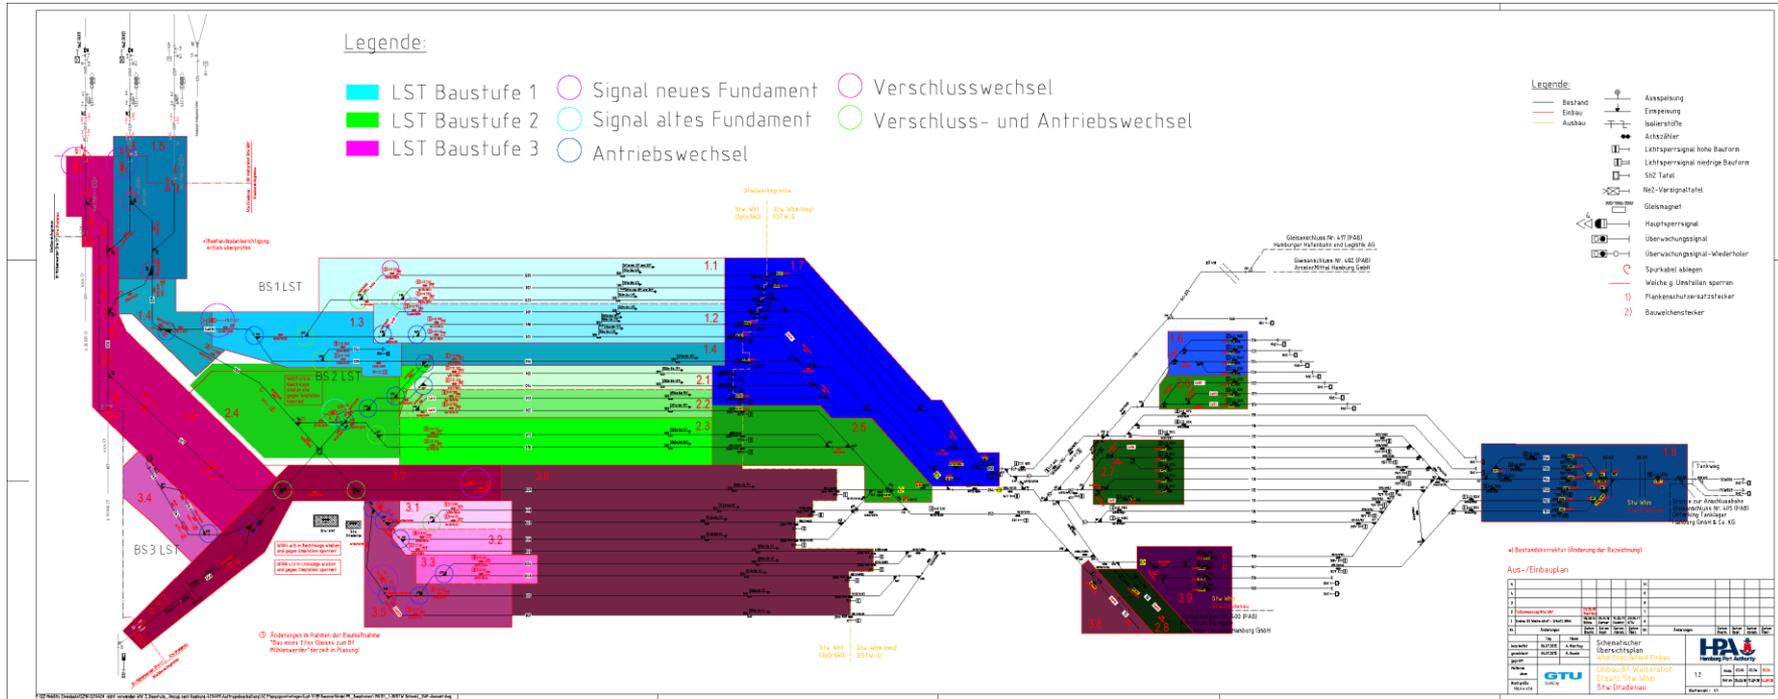


Terminplan: **Baustufe 1: 14.08.2019 – 18.08.2019**  
**Baustufe 2: 29.08.2019 – 01.09.2019**  
**Baustufe 3: 10.09.2019 – 14.09.2019**

# Baustufe 1.1

## Baustufe 1.1

14.08.2019; 7:00 Uhr – 12:00 Uhr

- Gleis 020, 021 und 022
- Signale Ls 20X, 21X und 22X
- Weichen 034 und 036
- OL-Schaltgruppe SG 118

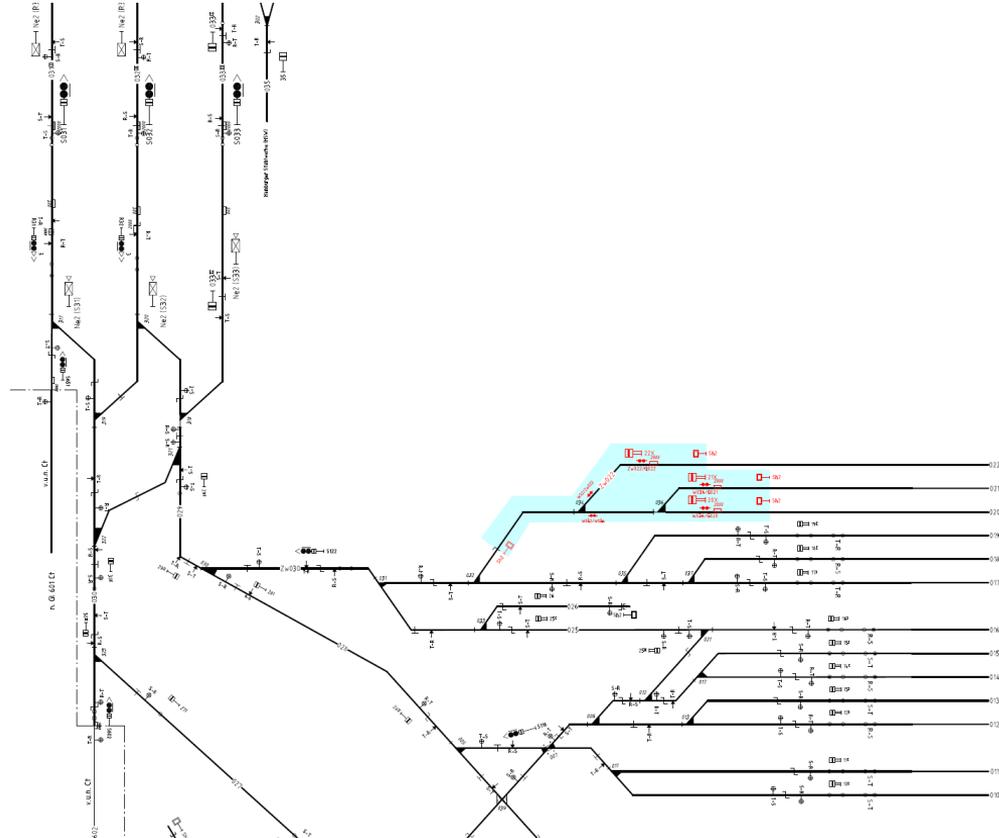


# Baustufe 1.2

## Baustufe 1.2

14.08.2019; 13:00 Uhr – 18:00 Uhr

- Gleis 017, 018 und 019
- Signale Ls 17X, 18X und 19X
- Weichen 035 und 037
- OL-Schaltgruppe SG 178

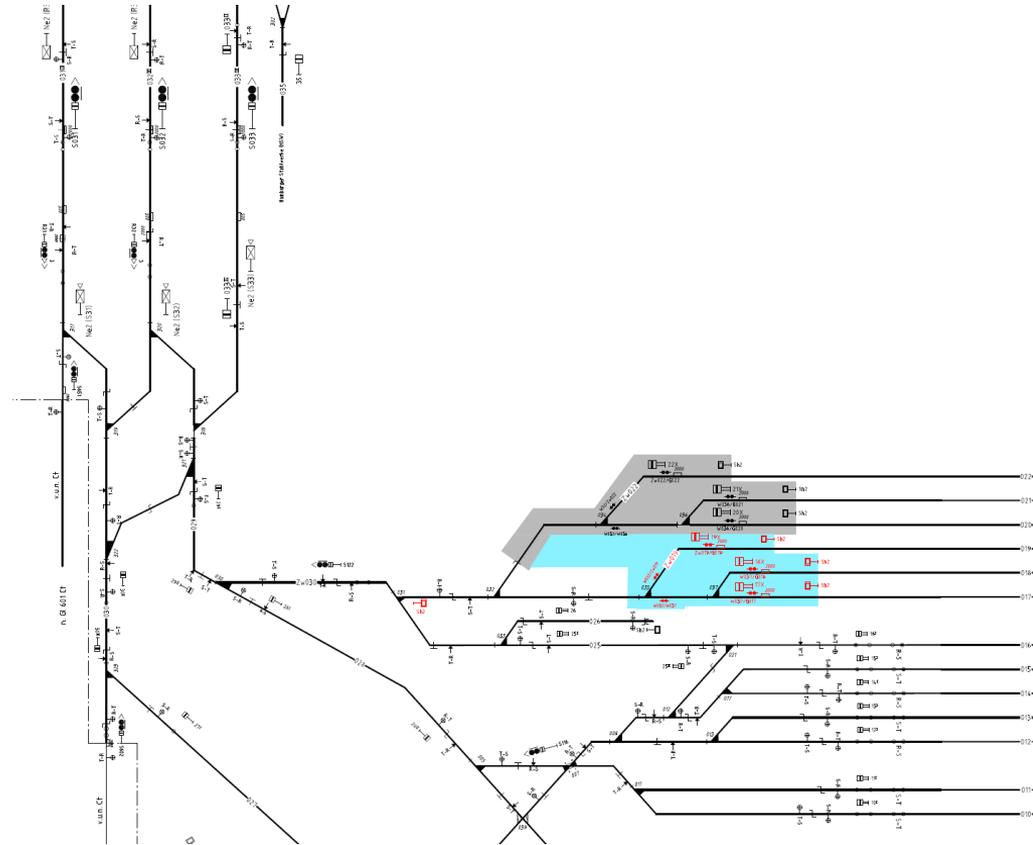


# Baustufe 1.3

## Baustufe 1.3

15.08.2019; 7:00 Uhr – 12:00 Uhr

- Gleis 025, 026 und 030
- Signale Ls 25X, 26X und 25Y
- Weichen 031, 032 und 033
- OL-Schaltgruppe SG 24

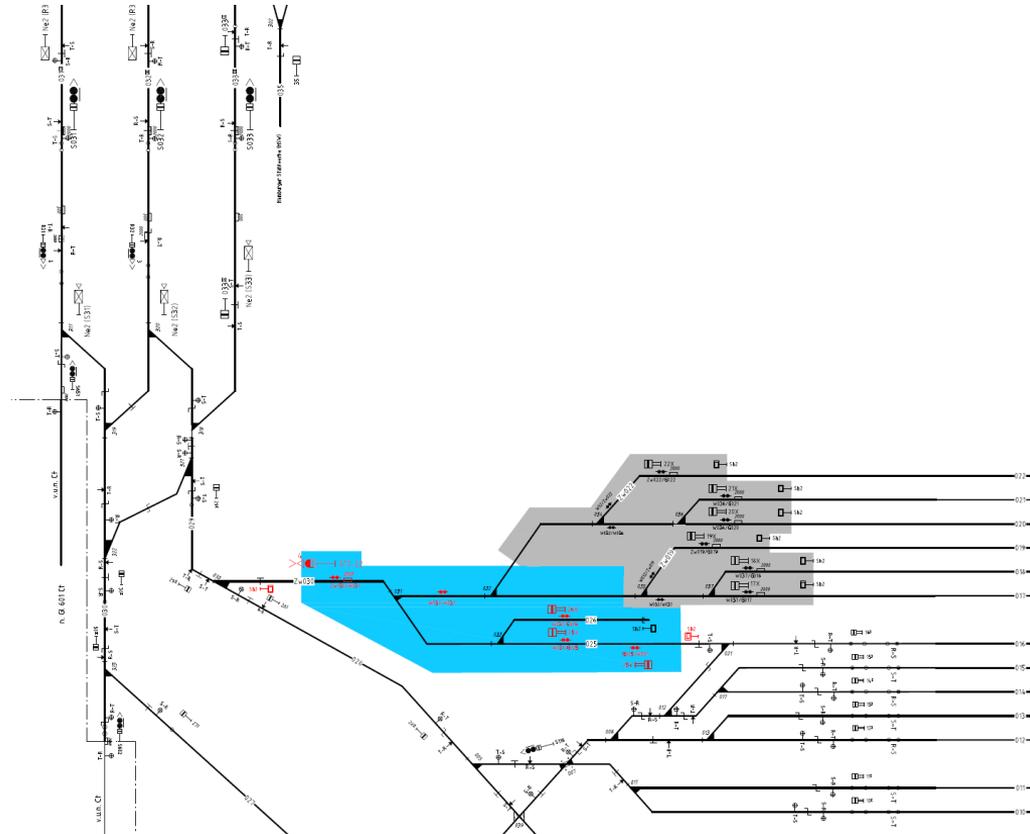


# Baustufe 1.4

## Baustufe 1.4

16.08.2019; 7:00 Uhr – 17:00 Uhr

- Gleis 016, 028 und 029
- Signale Ls 16X, 28X, 29X und 29Y
- Weichen 021 und 030
- OL-Schaltgruppe SG 24

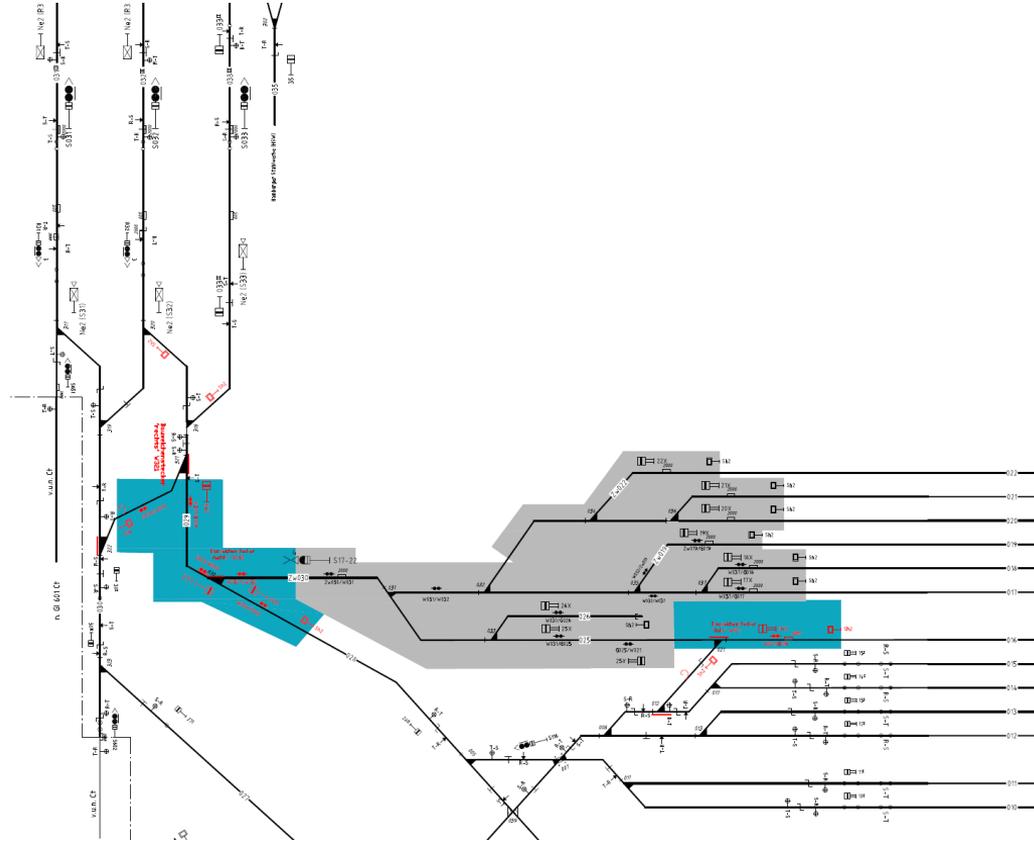


# Baustufe 1.5

## Baustufe 1.5

17.08.2019; 7:00 Uhr – 18:00 Uhr


- Gleis 032 und 033
- Signale R32 und LS 33Y
- Weichen 318, 320 und 321
- OL-Schaltgruppen SG 4 und SG 424

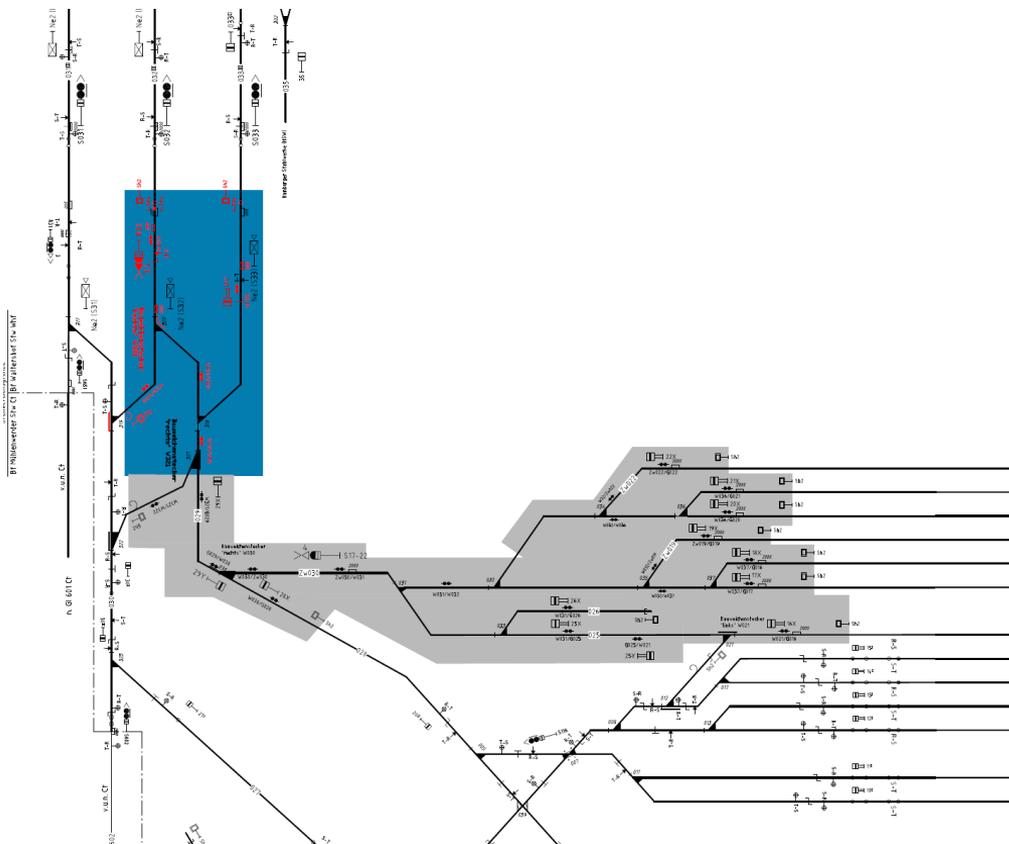

## Baustufe 1.6

Kontinuierlich während der Baustufen 1.1 bis 1.5

- Einbau neue Achszähler

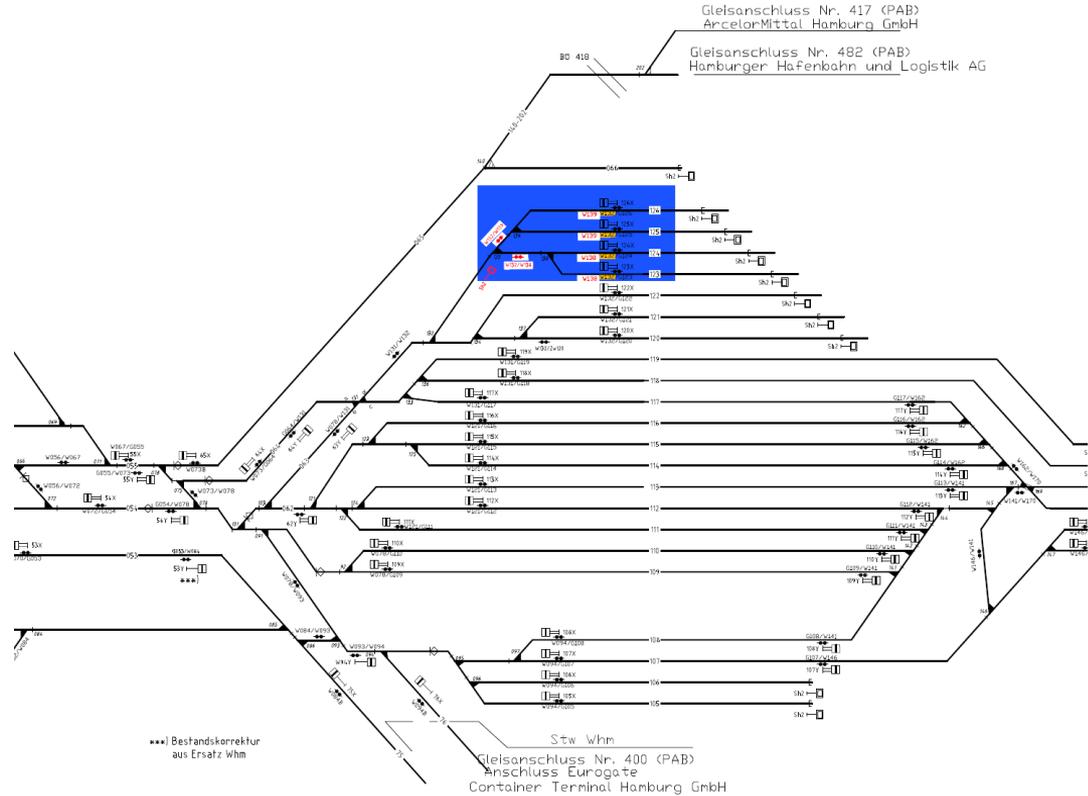


# Baustufe 1.7

## Baustufe 1.7

Kontinuierlich während der Baustufen 1.1 bis 1.5


- Einbau neue Achszähler

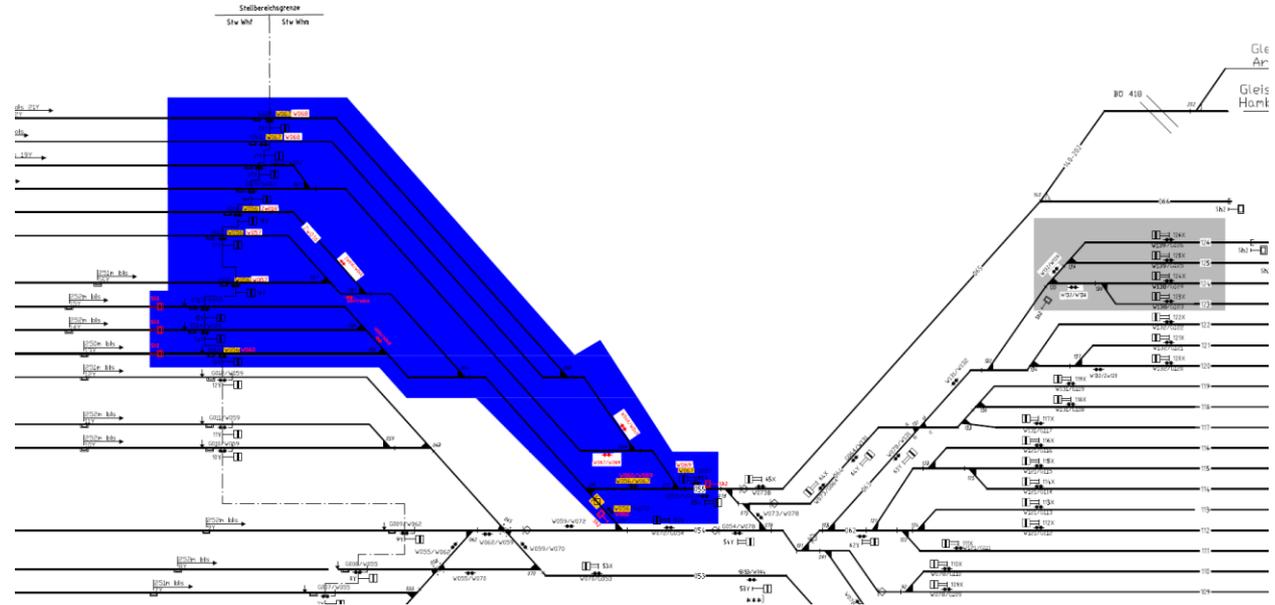

## Baustufe 1.8

Kontinuierlich während der Baustufen 1.1 bis 1.5

- Einbau neue Achszähler

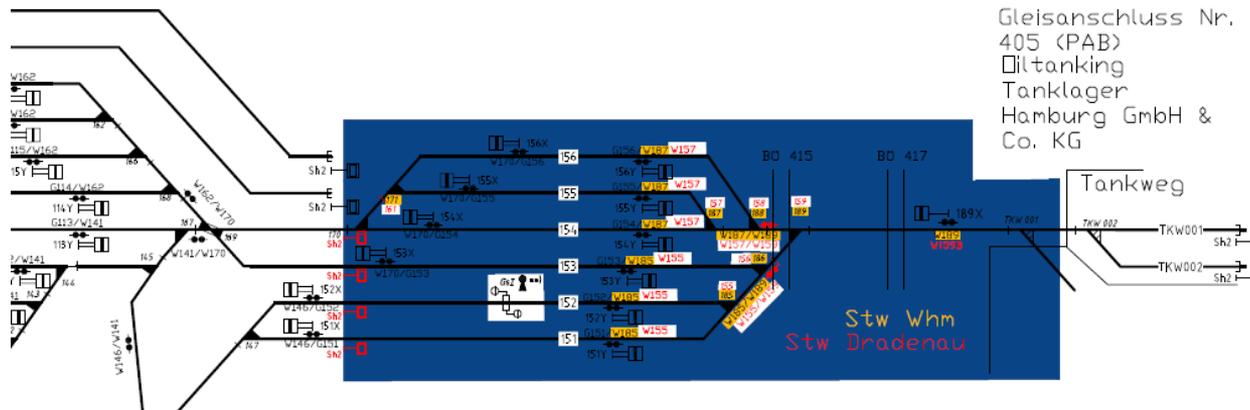







# 06

---

Eingeschränkte Werkstattleistung ab vsl. Juni 2019 in  
folge Baumaßnahmen Veddelkanalbrücken

Dirk Ehlert



Quelle: © HPA-RS Dirk Ehlert

**Eingeschränkte Werkstattleistung ab vsl. Juni 2019 in  
folge Baumaßnahmen Veddelkanalbrücken (VKB)**



Quelle: © HPA-RS Dirk Ehlert

## Ausgangssituation

- **Temporäre eingeschränkte Werkstatteleistung ab Q2/ 2019**

## Leistungsumfang im Zeitraum der „Baumaßnahme VKB“

- Fristen an Güterwagen
- Untersuchungen nach Kundenwunsch
- Übergabeuntersuchungen sowie Qualitätsprüfungen nach Instandhaltung
- Prüfung nach AVV (Anlage 10)
- Prüfung der betrieblichen Einsatzbedingungen (VPI)
- Tausch von Bremsbauteilen
- Tausch von Anbauteilen
- Br0 nach bspw. Bremssohlentausch
- Allgemeine Messtätigkeiten am Fahrzeug (Radsätze, Pufferstand etc.)
- Betriebsfreigabe nach Instandhaltung
- Vermietung von Lagerflächen für Ersatzteile der Fahrzeuge
- Sonderarbeiten nach Kundenwunsch bspw. im Gleis 66



# 07

---

## Organisatorisches

Leitung Vertrieb der Hafенbahn: Jana Bonk / [jana.bonk@hpa.hamburg.de](mailto:jana.bonk@hpa.hamburg.de),  
Tel. 040 42847 - 1896

Netzzugang/Entgelt: Matthias Krüger / [matthias.krueger@hpa.hamburg.de](mailto:matthias.krueger@hpa.hamburg.de),  
Tel. 040 42847 - 1836

Service Center: Jens Pillkahn / [jens.pillkahn@hpa.hamburg.de](mailto:jens.pillkahn@hpa.hamburg.de),  
Tel. 040 42847 - 5570)

Service Gleisanschlüsse: Frank Schönwald / [frank.schoenwald@hpa.hamburg.de](mailto:frank.schoenwald@hpa.hamburg.de),  
Tel. 040 42847 - 1834

Waggonwerkstatt: Dirk Ehlert / [hafenbahn-werkstatt@hpa.hamburg.de](mailto:hafenbahn-werkstatt@hpa.hamburg.de),  
Tel. 040 42847 - 4393

# Wie kann ich mich informieren?

## 1. Infoveranstaltungen

**Nächster Termin:**  
 Donnerstag,  
 11. April 2019  
 15:00 Uhr

## 2. Newsletter




**Anmeldung:**  
[service-gleisanschluesse@hpa.hamburg.de](mailto:service-gleisanschluesse@hpa.hamburg.de)

## 3. Internet

### VON DER KAIKAN-ND

ist das Bänderglied zwischen den Container-Schiffen ermittelbar. Egal, ob die zu weit transportiert im Eisenbahnverkehrs-Güterzüge den Hafenbahn, stellt die Hafenbahn zur Verfügung.

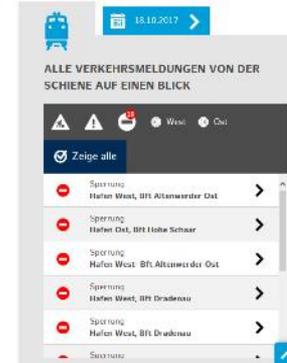

<https://www.hamburg-port-authority.de/de/auf-der-schiene/>

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



© HPA-Bildarchiv, Andreas Schmidt-Wiethoff

## **Hamburg Port Authority AöR**

Neuer Wandrahm 4

20457 Hamburg

Tel.: +49 40 42847-0
