

BAUINFORMATIONEN

Februar 2026

HPA Railway Infrastructure

Donnerstag, 26. Februar 2026

Mathias Sternke

Agenda

01

Oberbau 2026 & Ausblick 2027
Markus Wolf

02

Bauprogramm LST 2026
Markus Wolf

03

Finkenwerder Brücke 2026
Thomas Witt

04

Reminder: Sperrung Hansaport Ostern & Pfingsten 2026
DEGES

05

Neue Bahnbrücke Kattwyk & Rethebrücke
2026/2027 | Dr. Stephan Kräßig

06

transPORT rail - Wartung
Wolf-Jobst Siedler

07

Zusammenfassung Baumaßnahmen
Ostern & Pfingsten - Übersichtskarten

08

Fragen & Antworten

Bauprogramm Oberbau 2026 und Ausblick 2027

Markus Wolf


01

Gleiserneuerung HBR 818G, HBR 819G


HBR 818G, HBR 819G

Sa., 23.05.2026, 07:00 Uhr bis
Mo., 25.05.2026, 07:00 Uhr
(Pfingsten 2026)


Vollsperrung der Zufahrt zum
Westhafen für 48h einschl.
Abschaltung der Oberleitung

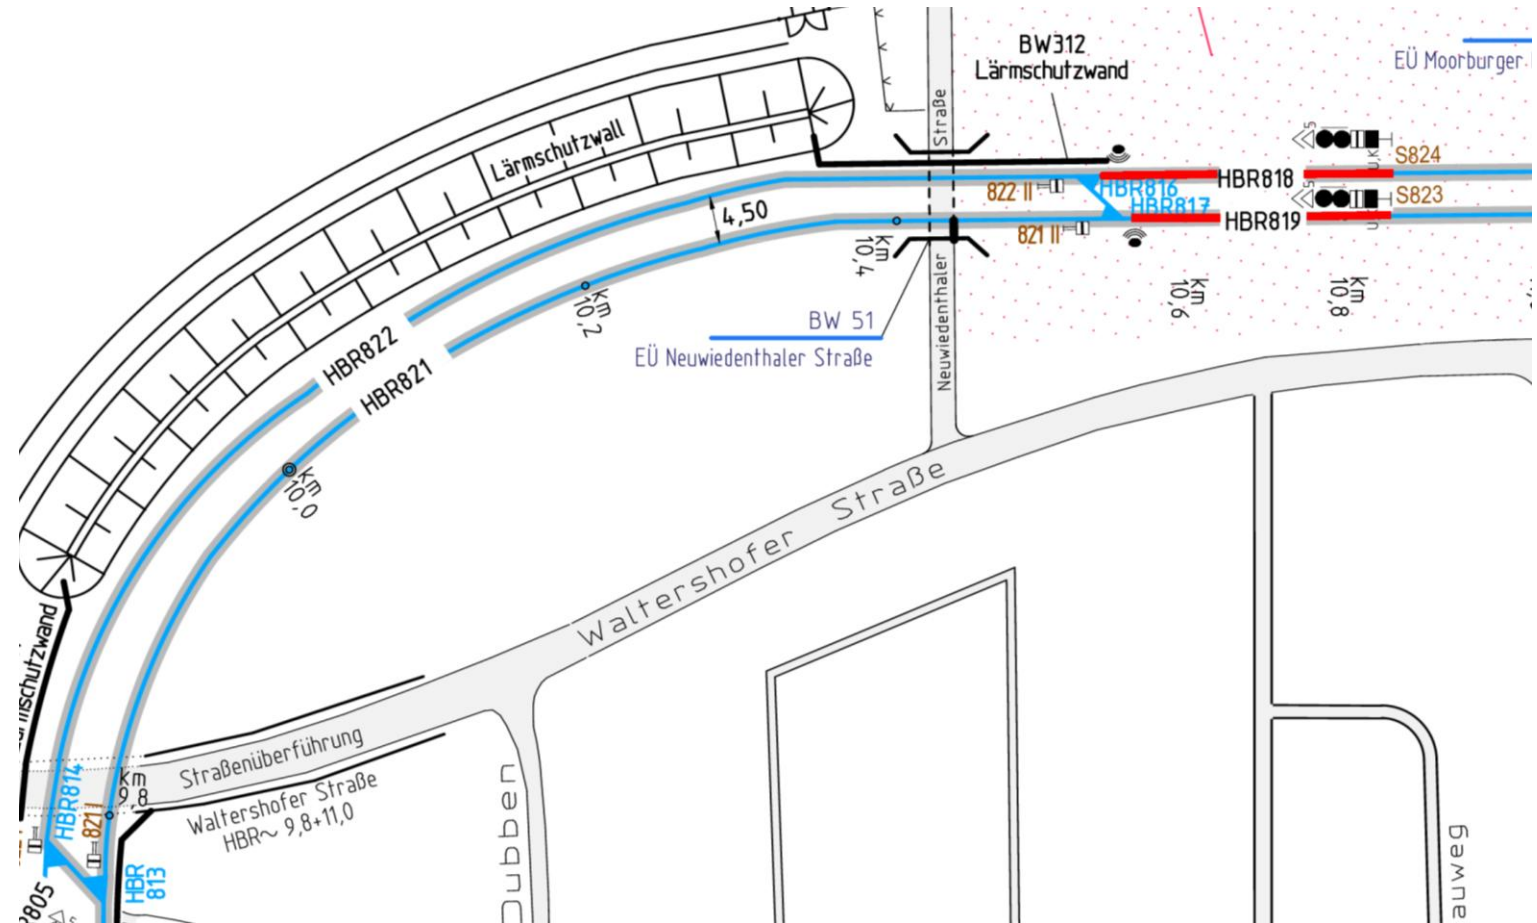

Fr., 07.08.2026, 08:00 Uhr bis Mo., 31.08.2026, 16:00 Uhr (Während Sperrung der NBK)

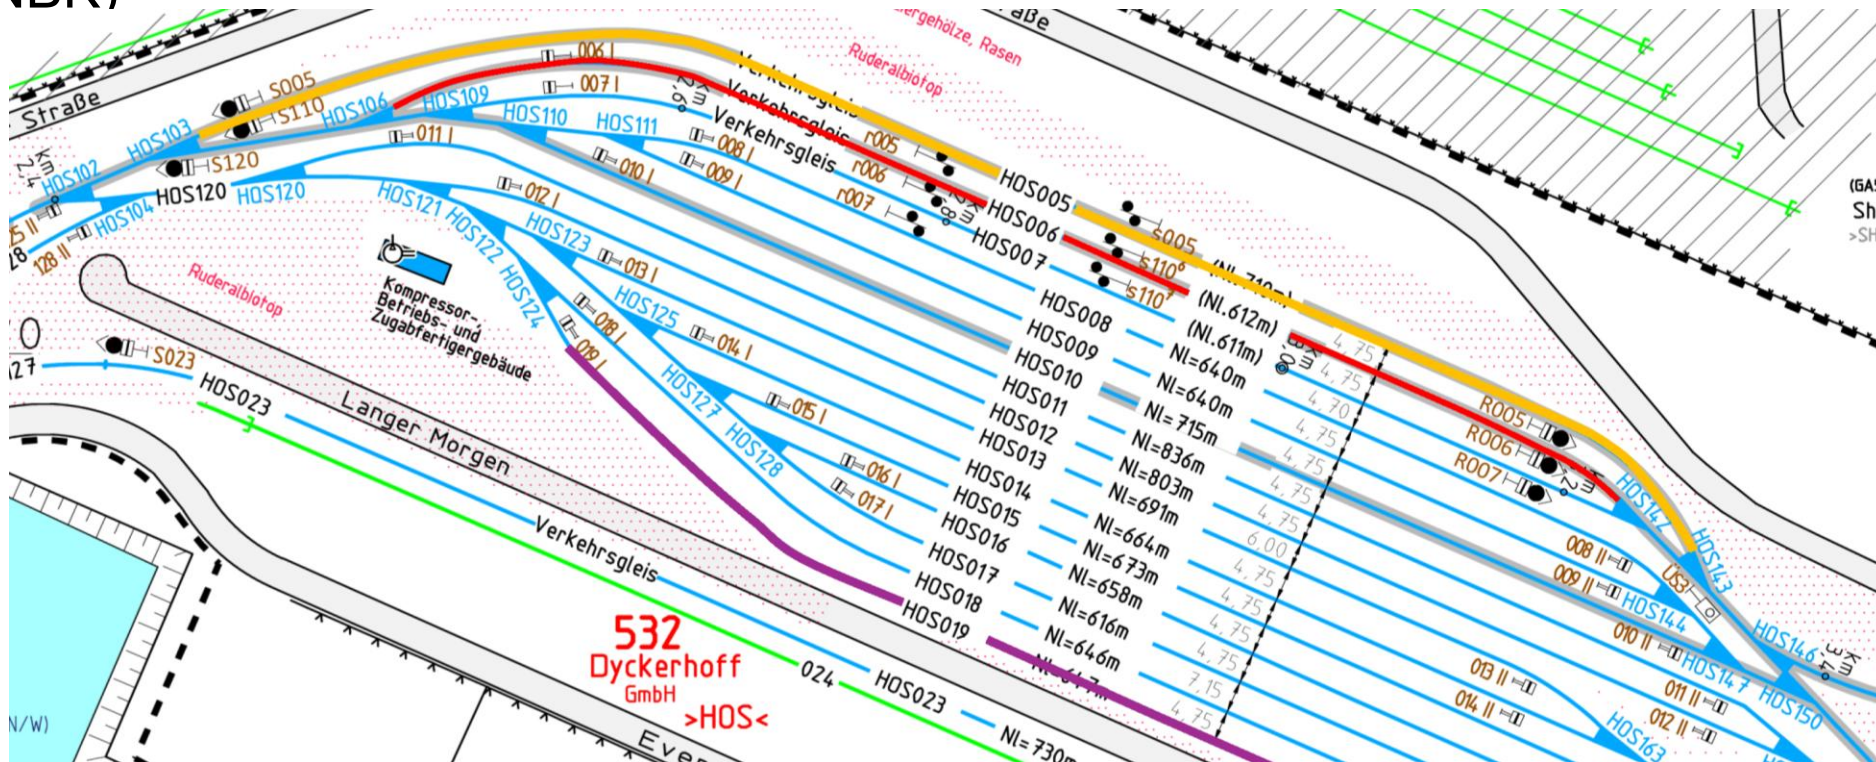

Fr., 04.09.2026, 08:00 Uhr bis
Di., 08.09.2026, 16:00 Uhr

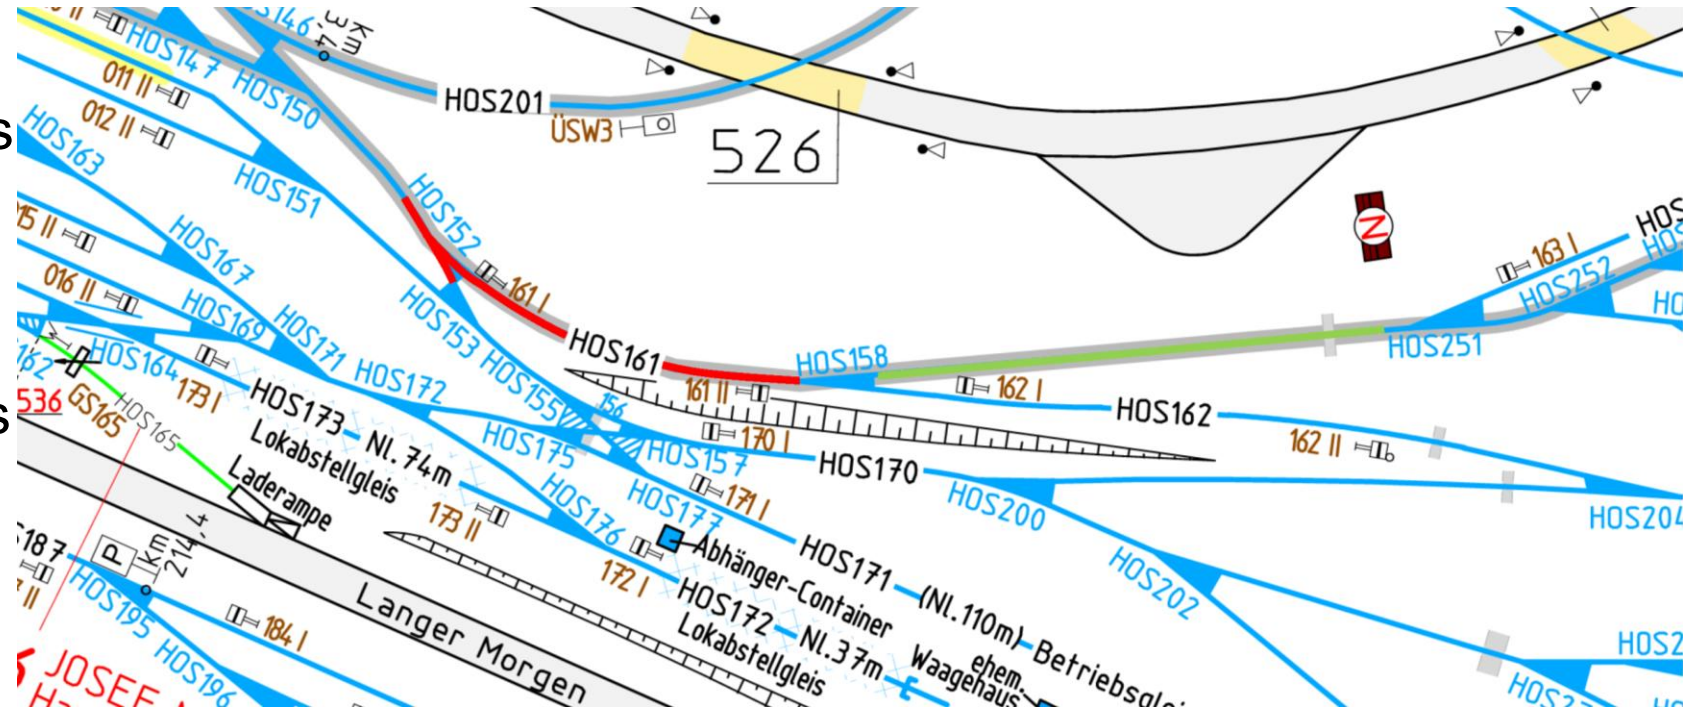

Fr., 18.09.2026, 16:00 Uhr bis
Mo., 21.09.2026, 05:00 Uhr



Schienenerneuerung ASE 502/504G, ASE 501/503G

ASE 502G, ASE 504G


Schienen abziehen: So., 27.09.2026, 07:00 Uhr - 11:00 Uhr

Schienenwechsel: Sa., 03.10.2026, 10:00 Uhr bis Mo., 05.10.2026, 22:00 Uhr

ASE 501G, ASE 503G

Schienen abziehen: So., 27.09.2026, 11:00 Uhr - 17:00 Uhr

Schienenwechsel: Sa., 10.10.2026, 10:00 Uhr bis Mo., 12.10.2026, 22:00 Uhr

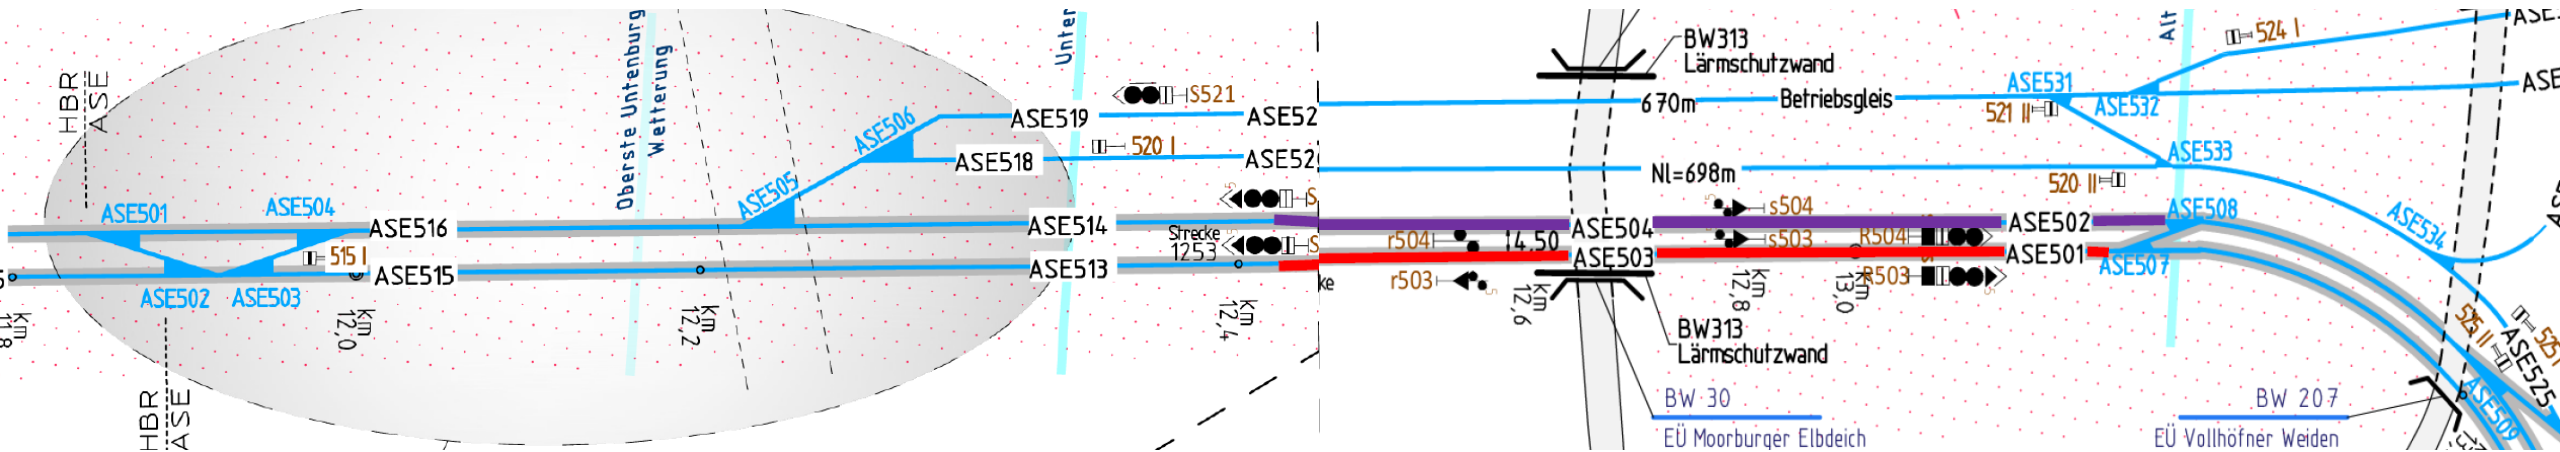

Do., 15.10.2026, 10:00 Uhr bis Di., 20.10.2026, 15:00 Uhr

HBS 103_109V: Mi., 21.10.2026, 08:00 Uhr bis Fr., 23.10.2026, 10:00 Uhr



Mo 02.11.2026, 08:00 Uhr bis Fr 06.11.2026, 15:00 Uhr

Sa 07.11.2026, 08:00 Uhr bis Mo 09.11.2026, 15:00 Uhr

Mo 09.11.2026, 08:00 Uhr bis Fr 13.11.2026, 15:00 Uhr

Mo 16.11.2026, 08:00 Uhr bis Do 19.11.2026, 15:00 Uhr

Sa 21.11.2026, 08:00 Uhr bis Mo 23.11.2026, 15:00 Uhr



Mo 23.11.2026, 08:00 Uhr bis Do 26.11.2026, 15:00 Uhr



HOS 142W, HOS 143W, HOS
203G, HOS 221W, HOS 222W,
SUD 801W

Fr., 10.09.2027, 07:00 Uhr bis
Mo., 20.09.2027, 16:00 Uhr

Keine Fahrten über die Südbahn möglich!

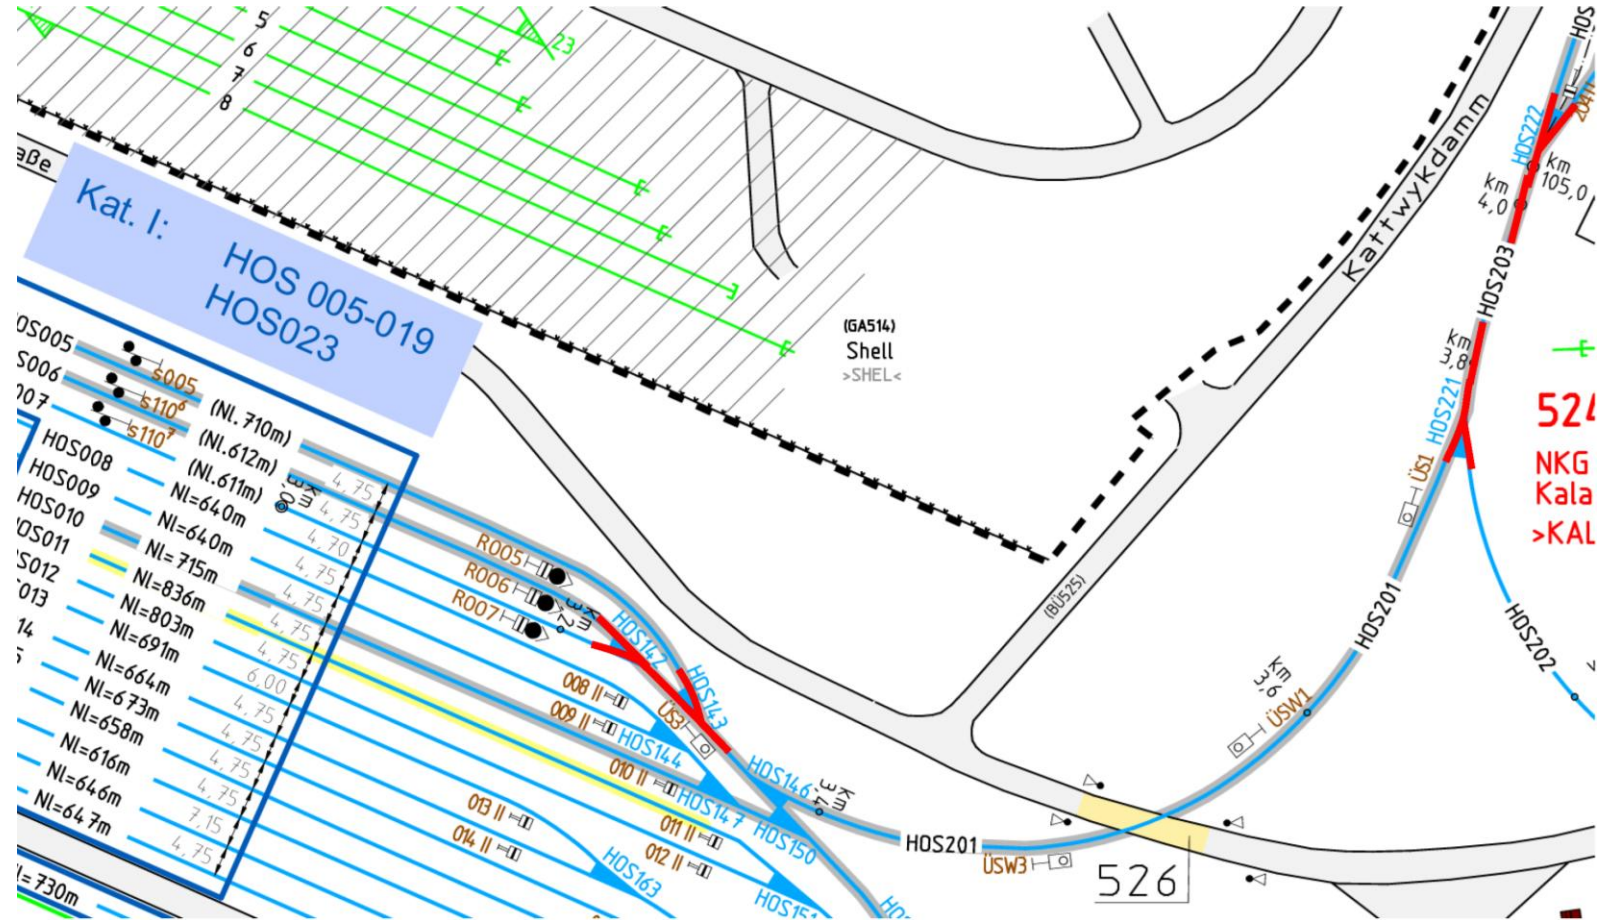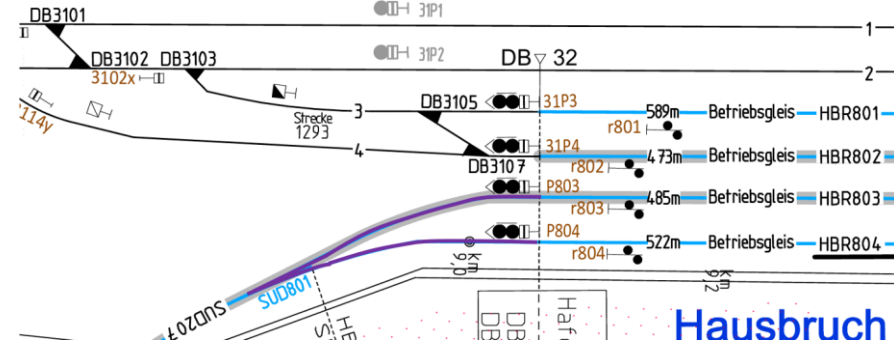


Bauprogramm LST 2026

Markus Wolf

02

Erneuerung der Bahnübergänge BÜ 501a, BÜ 502 und BÜ 505 (Rethekette) mit Erweiterung der Stellwerksanlage

- Die Gesamtmaßnahme umfasst die Erneuerung der Bahnübergänge und die Erweiterung der Stellwerksanlage Hohe Schaar Hof in den Außen- und Innenanlagen
- Die Realisierung erfolgt in 3 Schritten
 - Baustufe 0: Vorbereitende Arbeiten im Stellwerk Hohe Schaar (2026)
 - Baustufe 1: Erneuerung BÜ 505 mit Erweiterung der dafür notwendigen Stellwerksanlagen (2026)
 - Baustufe 2: Erneuerung BÜ 501a und 502 mit Erweiterung der dafür notwendigen Stellwerksanlagen (2027)

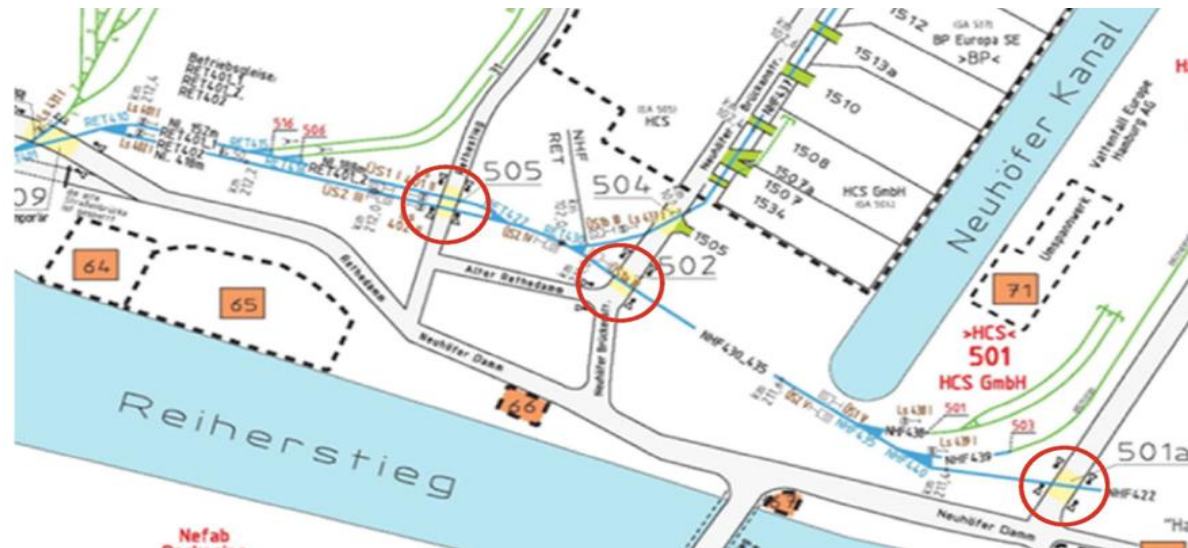

Erneuerung der Bahnübergänge BÜ 501a, BÜ 502 und BÜ 505 (Rethekette) mit Erweiterung der Stellwerksanlage

■ Betriebliche Auswirkungen 2026

- Baustufe 0 - Vorbereitende Arbeiten im Stellwerk Hohe Schaar:

**Das Stellwerk „Hohe Schaar“ ist in der Nacht vom
03. Juli auf dem 04. Juli 2026
für mehrere Stunden nicht bedienbar.**

- Baustufe 1- Erneuerung BÜ 505 mit Erweiterung der dafür notwendigen Stellwerksanlagen:


**Im September 2026 ist das Wochenende vom 18. September bis 20. September 2026
für die Abnahme und Inbetriebnahme vorgesehen.**


**In diesem Zeitraum werden die Gleise 401 und 402 sukzessive gesperrt,
so dass zeitweise kein Betrieb zwischen den Bahnhofsteilen Bft Hohe Schaar
und Bft Hamburg Süd möglich ist.**

Erneuerung Stromversorgung im Bft Waltershof

- LST – IBN Pfingstmontag, am 25.05.2026, 07:00-19:00 Uhr (12 Stunden)
- Folgende Bahnhofsteile können durch die Sperrung nicht erreicht werden:

Alte Süderelbe, Altenwerder – Ost, Dradenau

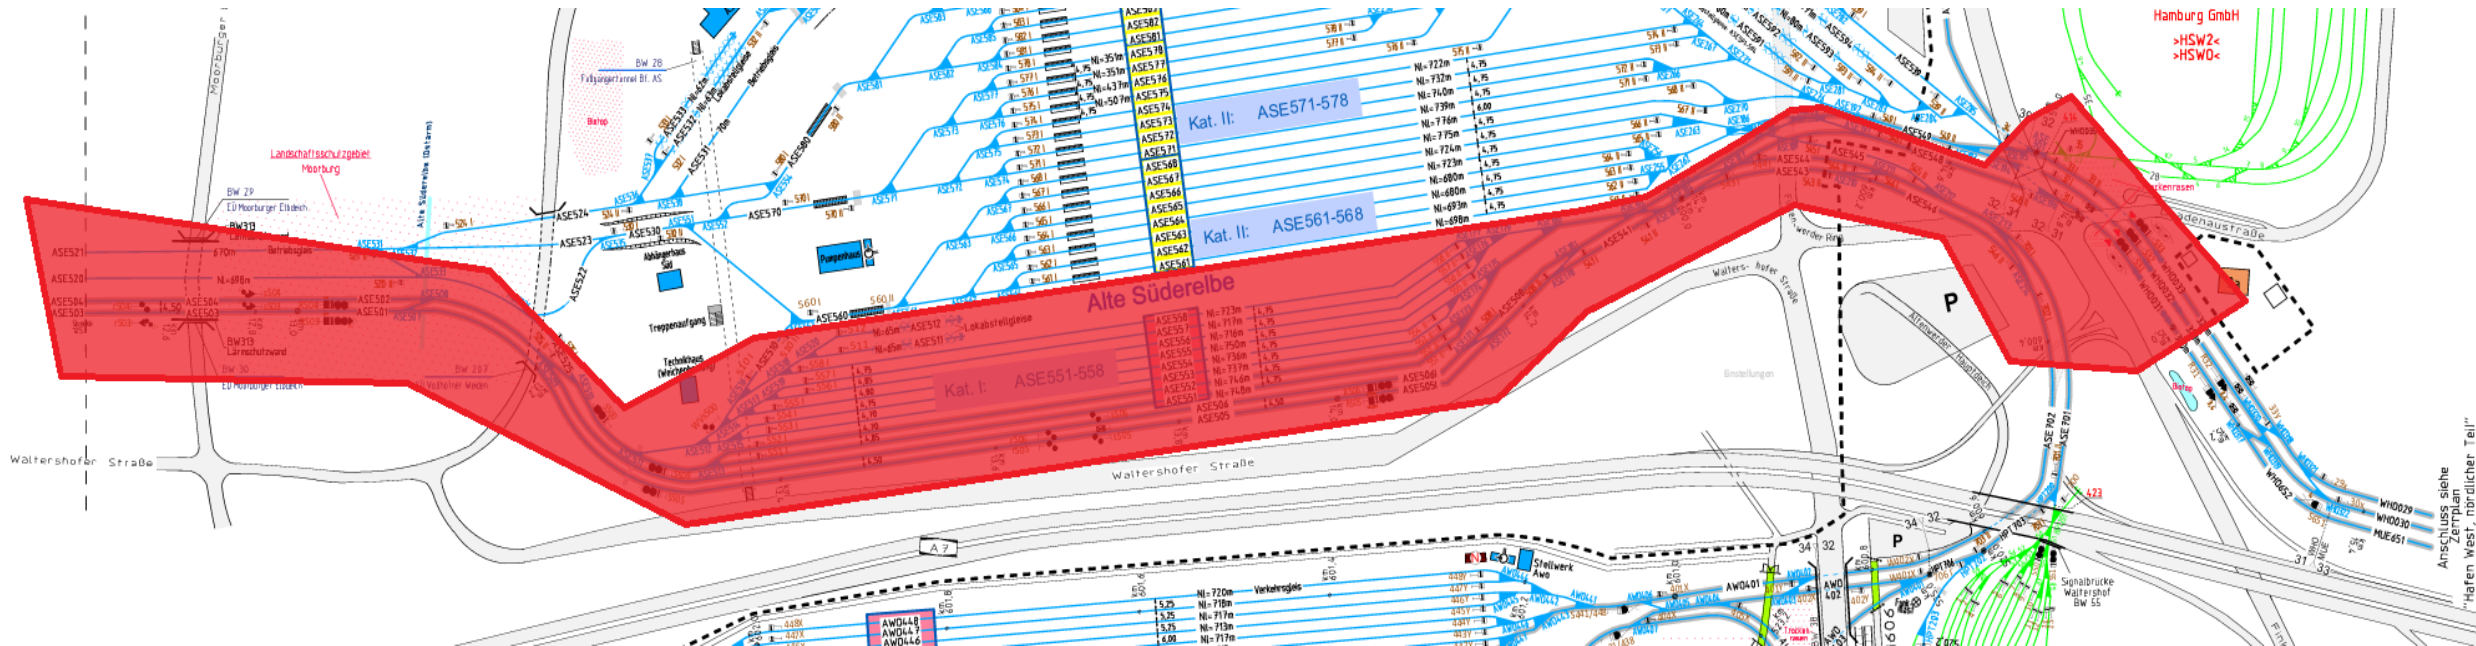




Erneuerung Stromversorgung im Bft Waltershof

- Zusätzlich kann das Stellwerk Dradenau in dem Zeitraum der IBN nicht bedient werden.



Rückbau Weiche HOS009 im Bahnhofsteil Hohe Schaar

- Voraussichtlicher Termin: 18.07.2026 - 22.07.2026
- Sperrbereiche:
 - Gleis HOS105
 - Gleis HOS145
 - Weiche HOS009
- LST Anpassungen:
 - Umbau Achszähltechnik
Gleis 105 (Az GI150I & GI150II)
Gleiskreis Weiche 009
 - Rückbau Weiche 009
 - Rückbau Ls154II

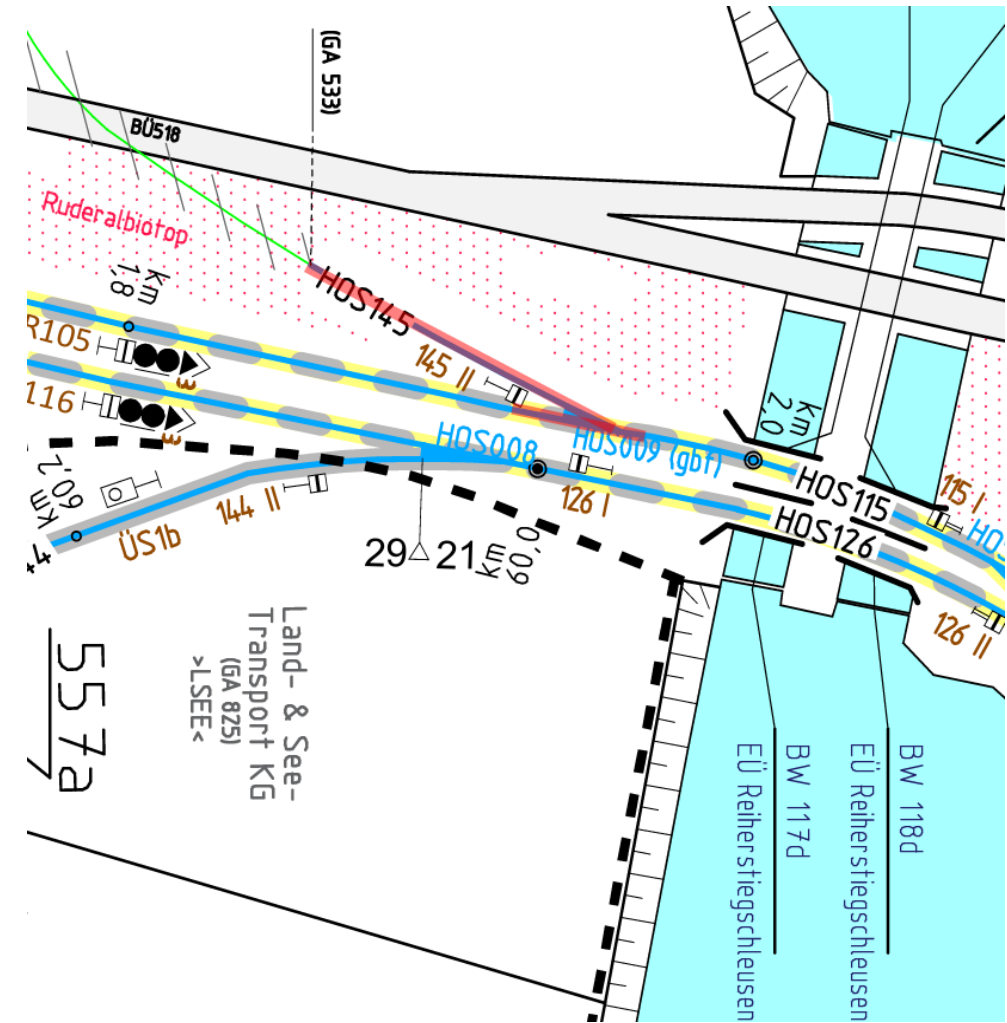

Ersatzneubau Finkenwerder Brücke 2026

Thomas Witt

03

H1-Prüfung nördliche Stahlbrücke

Sperrpause Ostersonntag, 05.04.2026, 08:00 h bis 05.04.2026, 16:00 h (Dauer 8 Stunden)



Vollsperrung der Gleise


AWW034, ASE539, ASE548, WHO031-033

Vollsperrung Weiche

ASE301, ASE195, ASEASE285, ASE193, ASE194, ASE196

Betroffene Schaltgruppen

SG 803, 404, 424, 108

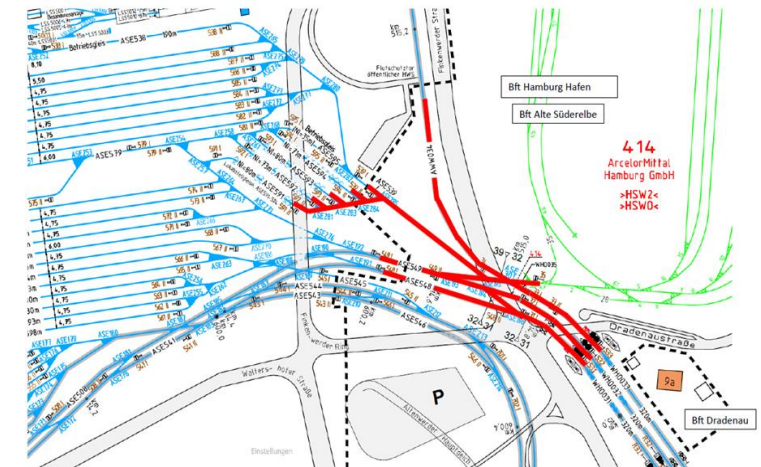

Auswirkungen:

Es sind keine Fahrten zwischen den Bft Alte Süderelbe und Bft Dradenau / Bft Mühlenwerder möglich!

Korrosionsschutzarbeiten nördliche Stahlbrücke

Sperrpause Pfingsten, Sa. 23.05.2026, 07:00 h bis Mo 25.05.2026, 07:00 h (Dauer 48 Stunden)

Beseitigen von Verschubschäden

Vollsperrung der Gleise


AWW034, ASE539, ASE548, WHO031-033

Vollsperrung Weiche

ASE301, ASE195, ASEASE285, ASE193, ASE194, ASE196

Betroffene Schaltgruppen

SG 803, 404, 424, 108

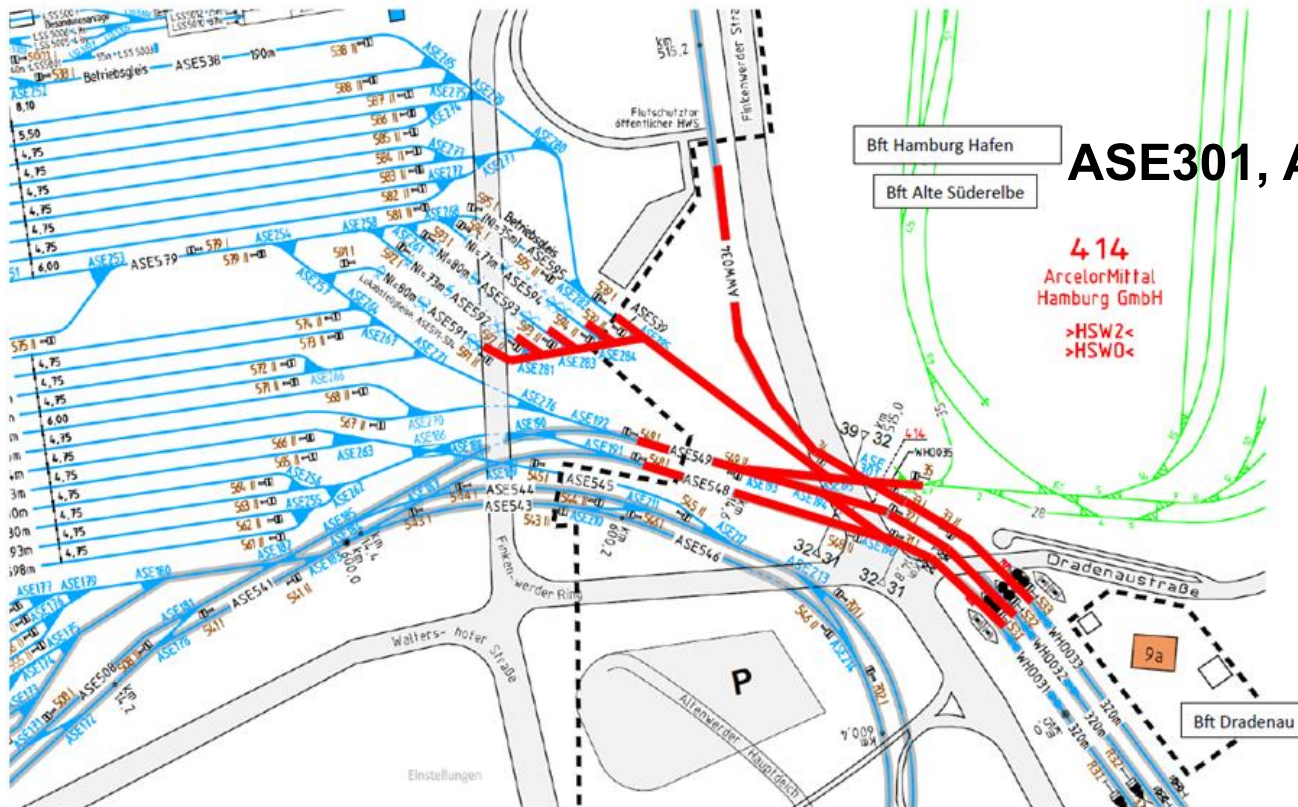

Sperrung „Hansaport“ Ostern und Pfingsten 2026

DEGES Herr Armin Ismic


04

Sperrung „Hansaport“ Ostern und Pfingsten 2026



Sperrung „Hansaport“ Ostern und Pfingsten 2026

Ostern 2026 Sperrung von 04.04.26 07:00 Uhr bis 06.04.2026 07:00 Uhr aufgrund der notwendigen Sperrung der Autobahn in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

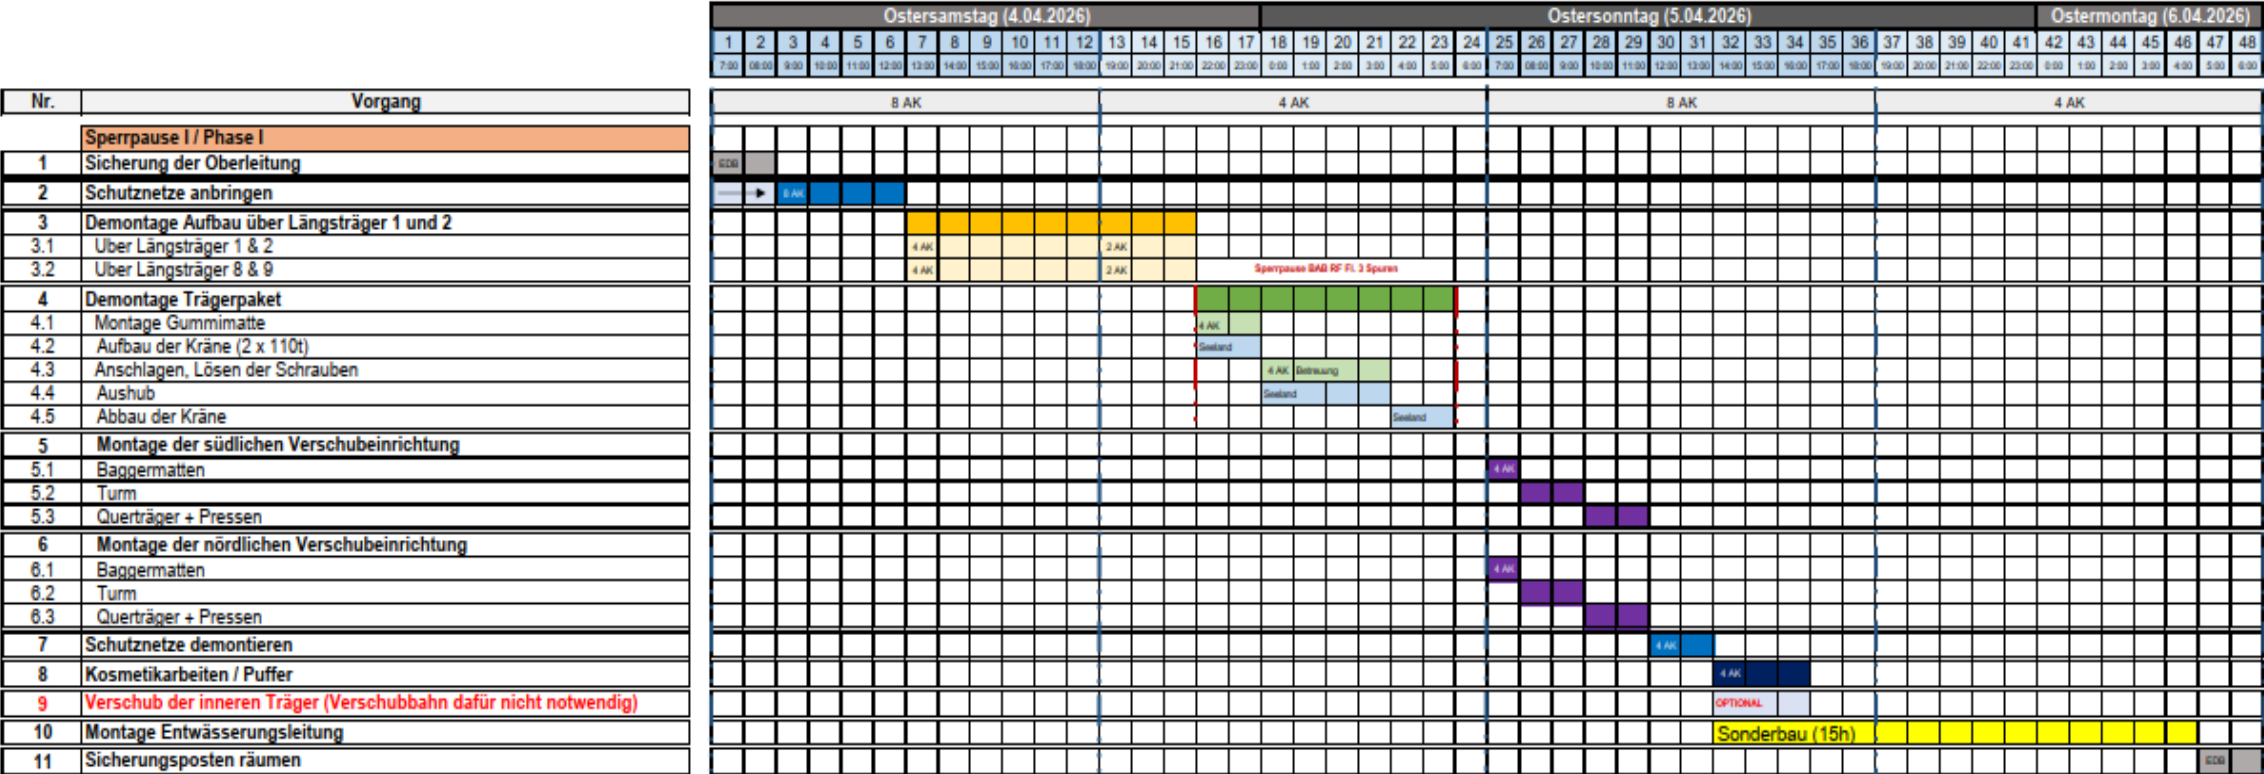

		Pfingstsamstag (23.05.2026)																	Pfingstsonntag (24.05.2026)																	Pfingstmontag (25.05.2026)																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Nr.	Vorgang																																																												
	Sperrpause II / Phase II																																																												
1	Sicherung der Oberleitung																																																												
2	Vorbereitung Demontage Stützen & Querverschub																																																												
2.1	Anschluss Pressen																																																												
2.2	Anhub des Querträgers																																																												
3	Rückbau Stützen																																																												
3.1	Schrauben Lösen																																																												
3.2	Nord																																																												
3.3	Süd																																																												
4	Querverschub Längsträger																																																												
4.1	Ablassen (Umstapeln notwendig)																																																												
4.2	Querverschub je Träger eine Stunde																																																												
4.3	Demontage Verschiebbahn																																																												
5	Restarbeiten / Nacharbeiten																																																												
5.1	Montage Erdung																																																												
5.2	Betonkosmetik																																																												
5.3	Trägerkosmetik																																																												
6	Montage Übertrittschutz																																																												
7	Sicherungsposten räumen																																																												

Baumaßnahmen an Neuer Bahnbrücke Kattwyk und Rethebrücke

Dr. Stephan Kräßig

05

Reminder 2026 Baumaßnahmen

■ Neue Bahnbrücke Kattwyk

- Zeitraum 11.07.2026 6:00Uhr bis 30.09.2026 17:00Uhr: Vollsperrung Bahn

Grund sind Arbeiten an der Antriebstechnik

■ Rethebrücke

- Zeitraum 20.04.2026 6:00Uhr bis 28.04.2026 17:00Uhr: Vollsperrung Bahn

Grund ist der Tausch zweier Hydraulikzylinder

Ausblick 2027 Baumaßnahmen

■ Neue Bahnbrücke Kattwyk

- Zeitraum etwa in Q2 oder Q3 2027: ca. 6-8 Tage Vollsperrung Bahn
- Grund ist die Technische Wartung / Prüfung / Inspektion der Antriebstechnik

■ Rethebrücke

- Zeitraum etwa KW16-KW17 2027: 8 Tage Vollsperrung Bahn

Grund ist der Tausch zweier Hydraulikzylinder

- Zeitraum etwa KW34-KW35 2027: 8 Tage Vollsperrung Bahn

Grund sind partielle Korrosionsschutzarbeiten am Überbau

transPORT rail

Wolf-Jobst Siedler

06

- Die HPA hat mit transPORT rail – Next Generation nunmehr eine (weitgehend) unterbrechungsfrei betreibbare IT-Plattform hergestellt. Dieser Mechanismus hat bereits mehrfach erfolgreich funktioniert.
- In Einzelfällen kann es doch zu notwendigen IT-Unterbrechungen kommen:
 - Bedarfsweises Zeitfenster: Dritter Samstagnachmittag im Monat im Zeitfenster von 18 bis 20 Uhr
 - Vorankündigung: So früh wie möglich und spätestens 10 Tage vorher angestrebt
- Im Einzelfall kann die Kritikalitätseinstufung der IT-Sicherheitsbehörden für kritische Infrastrukturen aber trotzdem ein anderes Vorgehen erfordern.


Zusammenfassung der Baumaßnahmen Ostern & Pfingsten -> Übersichtskarten

07

Übersicht: Baumaßnahmen im Westhafen Ostern 2026

48 Stunden TSP (Totalsperrung)

So., 05.04.2026, 08:00 Uhr bis
So., 05.04.2026, 16:00 Uhr (8 Stunden)

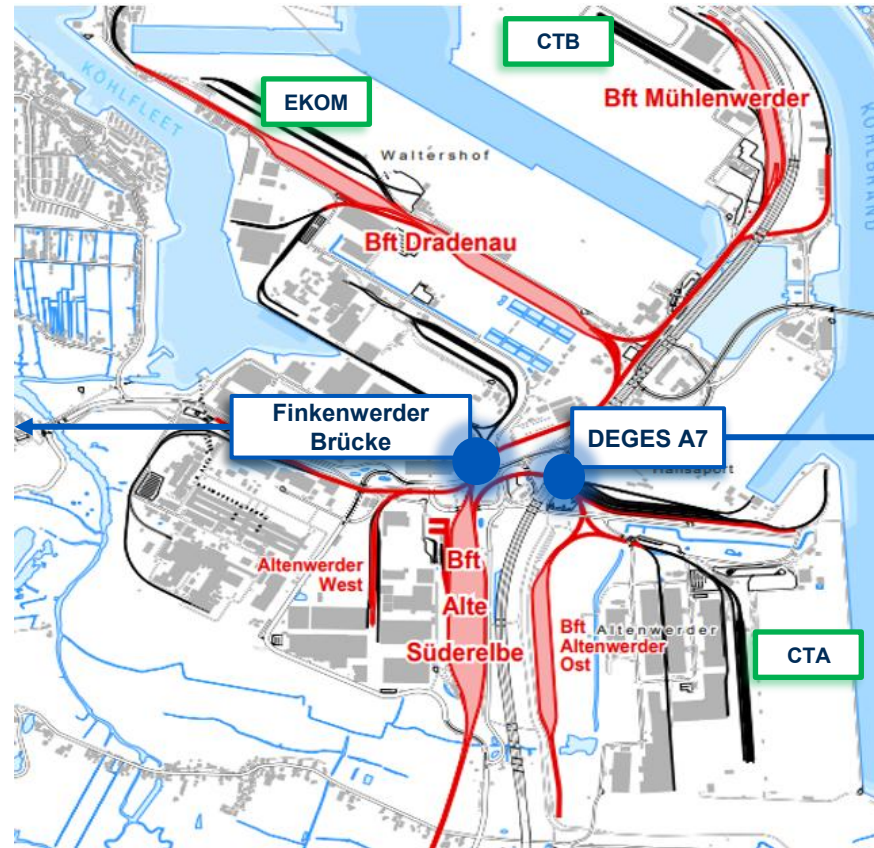


Sa., 04.04.2026, 07:00 Uhr bis
Mo., 06.04.2026, 07:00 Uhr (48 Stunden)

Übersicht: Baumaßnahmen im Westhafen Pfingsten 2026

60 Stunden TSP (Totalsperrung)

Sa., 23.05.2026, 07:00 Uhr bis
Mo., 25.05.2026, 07:00 Uhr (48 Stunden)

Sa., 23.05.2026, 07:00 Uhr bis
Mo., 25.05.2026, 07:00 Uhr (48 Stunden)

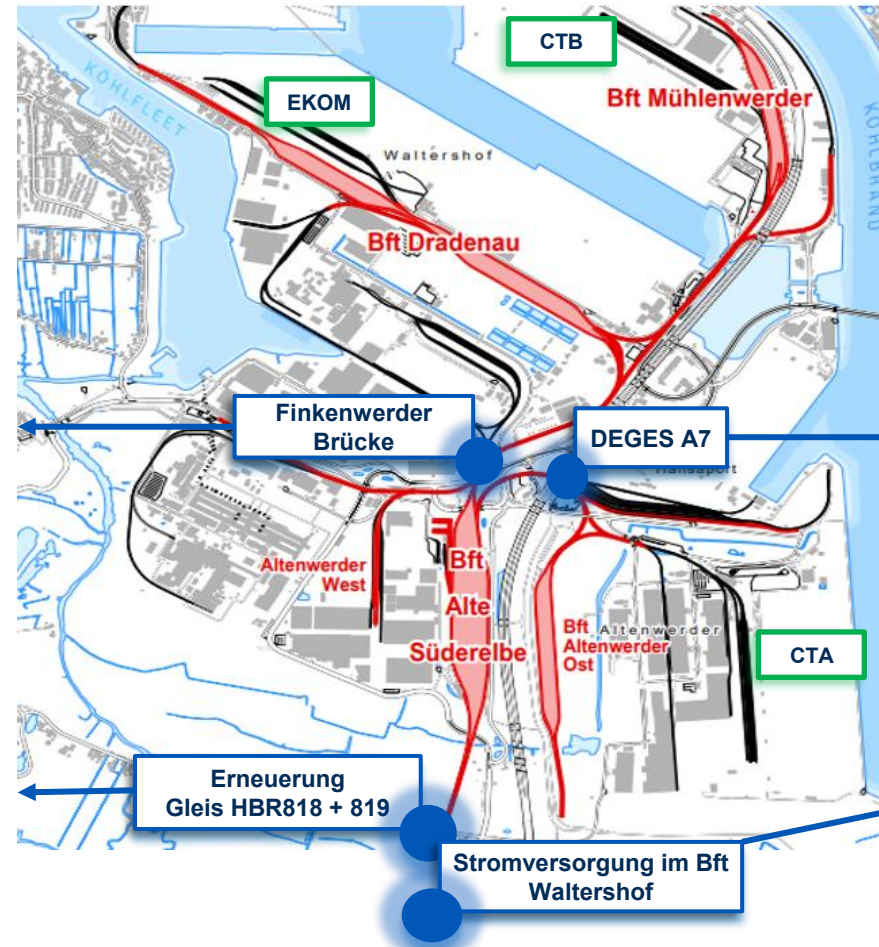

Sa., 23.05.2026, 07:00 Uhr bis
Mo., 25.05.2026, 19:00 Uhr (60 Stunden)

Mo., 25.05.2026, 07:00 Uhr bis
Mo., 25.05.2026, 19:00 Uhr (12 Stunden)

Fragen und Antworten

08

1. Infoveranstaltungen

• Nächster Termin:

Donnerstag, 28.05.2026

2. Newsletter


Bft Alte Süderelbe

- Bis auf Weiteres wurde für das HPA-Projekt „Ersatzneubau Finkenwerder Brücke“, zur Absicherung gegen die Gefahren aus dem Eisenbahnverkehr, am Gleis ASE 548/ Weiche ASE 196 eine Feste Absperrung montiert (Km 14,600- Km 14,700).
- Am So, 05.11.2023, von 08:00- 12:00 Uhr erfolgt im Rahmen der Anpassung der Bahn- anlagen für das DEGES Projekt „Neubau der A 26 West“, die Sperrung von Gleis ASE 506 Während dieser Sperrung verkehren alle Züge zwischen Bft Dradenau/ Bft Altenwerder Ost und Bft Alte Süderelbe eingleisig über Gleis ASE 505.
- Am So, 05.11.2023, von 12:00- 16:00 Uhr erfolgt im Rahmen der Anpassung der Bahn- anlagen für das DEGES Projekt „Neubau der A 26 West“, die Sperrung von Gleis ASE 502. Während dieser Sperrung verkehren alle Züge zwischen Bft Dradenau/ Bft Altenwerder Ost und Bft Alte Süderelbe eingleisig über Gleis ASE 505.
- Am Mo, 06.11.2023, von 08:00- 16:00 Uhr erfolgt im Rahmen der Anpassung der Bahn- anlagen für das DEGES Projekt „Neubau der A 26 West“, die Sperrung von Gleis ASE 505. Während dieser Sperrung verkehren alle Züge zwischen Bft Dradenau/ Bft Altenwerder Ost und Bft Alte Süderelbe eingleisig über Gleis ASE 502/ 506.
- Am Mo, 06.11. 2023, 08:00 Uhr bis Di, 07.11.2023, 17:00 Uhr erfolgt die Erneuerung der Stellwerksbatterie im Rangierstellwerk „Alte Süderelbe“. Während dieses Zeitraums ist kein automatischer Ablaufbetrieb möglich.
- Am Di, 07.11.2023, in der Zeit von 08:00- 12:00 Uhr erfolgt ein Ersatzschieneneinbau in der Weichenverbindung ASE 190_192, sowie Instandhaltungsarbeiten in der DKW ASE190. Es sind keine Fahrten über die nördliche Seite der Richtungsgleise ASE 561- 574 in Richtung Bft Dradenau/ Mühlenwerder/ Altenwerder Ost/ Gleisanschluss 430- *HHLA Container Terminal Altenwerder GmbH* möglich.
In dem o.g. Zeitraum verkehren alle Zugfahrten zwischen den Bahnhofsteilen Dradenau/ Mühlenwerder und Alte Süderelbe eingleisig über Gleis WHO 031/ ASE 548/ 541. Zugfahrten v.u.n. Gleis WHO 017- 022 in der Gleisgruppe Dradenau sind nicht möglich. Für Rangierfahrten steht zusätzlich die Westtangente (Gleis ASE 536- 539) zur Verfügung.

Anmeldung:

service-gleisanschluesse@hpa.hamburg.de

3. Internet

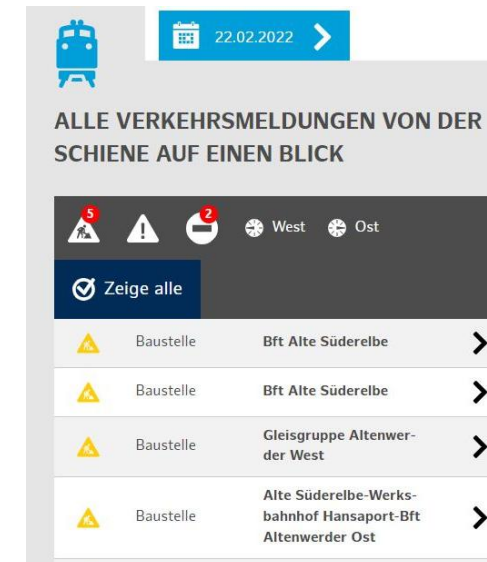

22.02.2022

ALLE VERKEHRSMELDUNGEN VON DER SCHIENE AUF EINEN BLICK

5 2 West Ost

Zeige alle

⚠	Baustelle	Bft Alte Süderelbe	➔
⚠	Baustelle	Bft Alte Süderelbe	➔
⚠	Baustelle	Gleisgruppe Altenwerder West	➔
⚠	Baustelle	Alte Süderelbe-Werks- bahnhof Hansaport-Bft Altenwerder Ost	➔

<https://www.hamburg-port-authority.de/de/schiene>



© HPA, Andreas Schmidt-Wiethoff

Hamburg Port Authority AöR
Neuer Wandrahm 4
20457 Hamburg
Tel.: +49 40 42847-0
